

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ


| Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле | 5 |
|--|----|
| Храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском | 7 |
| Храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке | 9 |
| Храм Царственных страстотерпцев на Войковской | 11 |
| Храм 12 апостолов в Ховрине | 13 |
| Храм преподобного Серафима Саровского в Дегунине | 15 |
| Храм святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, в Коптеве | 17 |
| Храм блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове | 19 |
| Храм праведного воина Феодора Ушакова на Речном вокзале | 21 |
| Храм праведного Алексия, пресвитера Московского, в Тимирязевском | 23 |
| Храм пророка Илии в Головине | 25 |


Ходынский бульвар, д. 6, с.1


Храм преподобного Сергия Радонежского


(освящен 22.10.2017)






















Архитектор: С.Я. Кузнецов

Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

АГР: ООО «Проект +»

Вместимость: 1000 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Площадь земельного участка | 5000 m^2 | | |
| 2 | Площадь застройки | $1068,5 \text{ m}^2$ | | |
| 3 | Общая площадь, в том числе надземная | 2263 м ² | | |
| 4 | Строительный объем | 13 017,6 м³ | | |
| 5 | Верхняя отметка | 29,600 м | | |

| Наименование храма | Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле |
|--|---|
| Настоятель | протоиерей Василий Биксей |
| Дата назначения настоятеля: | 12 марта 2012 г. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 4 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 6, стр. 1 |
| Округ | Северный |
| Район | Хорошевский |
| Численность населения района (приблизительно) | 75 000 чел. |
| Количество храмов в районе (с учетом строящегося) | 2 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 2,3 км (в другом районе через шоссе) |
| - с востока | 1,4 км |
| - с юга | 1,0 км (в другом районе через трассу) |
| | 3,5 км (в другом районе через грассу) |
| - с запада Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 100-600 чел. |
| Площадь участка | 0,5 ra |
| | Приход храма прп. Сергия Радонежского на Ходынском поле гор. |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | Приход храма прп. Сергия Радонежского на ходынском полетор. Москвы |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | Нет |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Деревянный храм Архангела Гавриила, на 100 чел., воздвигнут в память погибших героев-авиаторов |
| Год начала строительства основного храма | 2015 r. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | Храм построен. РС закончилось в 2017 г. |
| Вместимость строящегося храма, всего | 1000 чел. |
| - верхнего храма | 1000 чел. |
| - нижнего храма | 80 чел. |
| Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) | Храм построен и введен в эксплуатацию |
| Выполненные работы | Разработана проектная и рабочая документация, выполнены строи- тельные работы, подведены инженерные сети |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | _ |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | Октябрь 2017 г. |
| Срок подготовки к Великому освящению | 22 октября 2017 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки рилл совершил чин великого освящения |
| Примечания | |


| Сведения о проекте и инженерных с | етях | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Архитектор (ФИО): | Кузнецов С.Я. | | | |
| Разработчик АГР: | ООО «Проект+» (ИНН | 7730500390) | | |
| Год разработки АГР: | 2015 г. | | | |
| Проектировщик: | ООО «ИнвестПроектГрупп» (ИНН 7706771400, СРО № 0106.02-2012-7706771400-П-169 от 24.07.2012 г.) | | | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном об- | ьеме | | |
| Экспертная организация: | ООО «Экспертиза и Кон | ООО «Экспертиза и Консультирование» | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 77-2-1-2-0778-17 от 18 августа 2017 г. | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена полностью | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Канализация: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Водосток: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Газоснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получено | Оплачено | Подключено |

Генеральный подрядчик: ООО «СМУ-55» (уже не существует), ООО «ИнвестПроектГрупп» (ИНН 7706771400) Технический заказчик: ООО «Латурстрой» (ИНН 7719433180)


ул. Софьи Ковалевской, д. 7, стр. 1 (храм), стр. 2 (звонница), стр. 3 (приходской дом)

Храм блаженной Матроны Московской


(освящен 26.08.2018)

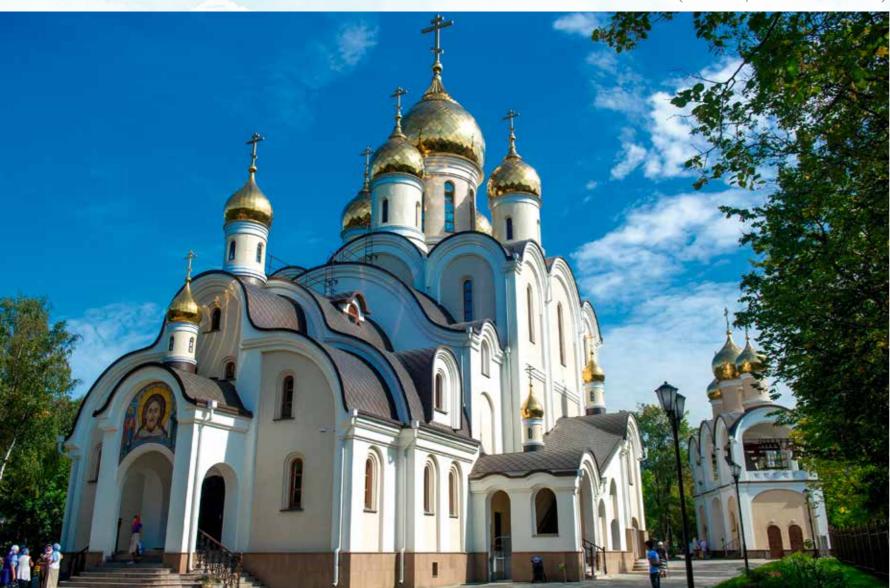








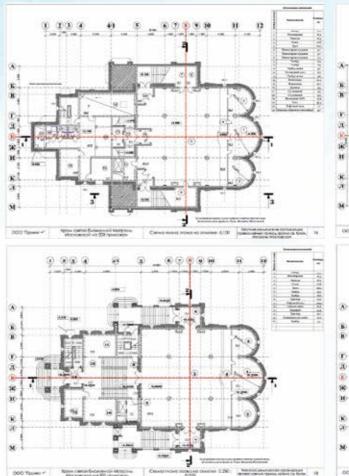

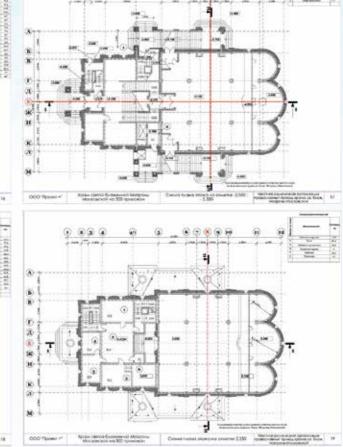

Архитектор: О.А. Баранникова Проектировщик: ООО «Проект +»

АГР: ООО «Проект +»

Вместимость: 500 человек (верхний храм), 300 человек (нижний крестильный храм)

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|--|---|
| 1 | Площадь застройки | Храм: 698, Дом причта: 273, Звонница: 85 м² |
| 2 | Общая площадь храма, в том числе | 1369 м ² |
| 3 | - надземная часть | 777 m² |
| 4 | - подземная часть | 582 м² |
| 5 | Общая площадь дома причта, в том числе | 582 м² |
| 6 | - надземная часть | 389 м² |
| 7 | - подземная часть | 193 м² |
| 8 | Общая площадь звонницы, в том числе | 582 м² |
| 9 | - надземная часть | 389 м² |
| 10 | - подземная часть | 193 м ² |
| 11 | Этажность | Храм: 3+подземный, Дом причта: 2+подземный, Звонница: 2+подземный |
| 12 | Наибольшая высота | Храм: 41,22, Дом причта: 16,54, Звонница: 23,4 м |

| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Програм | ме 200 | |
|--|---|--|
| Наименование храма | Храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе | |
| Настоятель | протоиерей Димитрий Синицын | |
| Дата назначения настоятеля: | 22.04.2008 | |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 2 | |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей | |
| Адрес храма | г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 7 | |
| Округ | Северный | |
| Район | Дмитровский | |
| Численность населения района (приблизительно) | 89 тыс. чел. | |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 1 | |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | | |
| - с севера | 3,2 км (в другом районе) | |
| - с востока | 5,3 км (в другом районе через шоссе) | |
| - с юга | 2,76 км (в другом районе через шоссе) | |
| - с запада | 1,85 км (в другом районе через шоссе) | |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 100 чел. | |
| Площадь участка | 0,5 ra | |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ | |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - | |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм демонтирован | |
| Год начала строительства основного храма | 2013 г. | |
| Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | PC получено, срок действия с 22.07.2015. г. по 22.01.2017. г. | |
| Вместимость строящегося храма, всего | 500 чел. | |
| - верхнего храма | 274 чел. | |
| - нижнего храма | 226 чел. | |
| Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) | Храм построен | |
| Выполненные работы | Выполнена проектная и рабочая документация, возведены стены, свод кровля, установлены купола и кресты, подведены сети, выполнено благоустройство территории | |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - | |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - | |
| Срок ввода в эксплуатацию | декабрь 2017 г. | |
| Срок подготовки к Великому освящению | 26 августа 2018 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения. | |

| Сведения о проекте и инженерных сетях | | |
|---|----------------------------------|--|
| Архитектор (ФИО): | Баранникова О.А. | |
| Разработчик АГР: | ООО «Проект +» (ИНН 7730500390) | |
| Год разработки АГР: | 2014-2015 rr. | |
| Проектировщик: | ООО «Проект +» (ИНН 7730500390) | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном объеме | |
| Экспертная организация: | Мосэксперт | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 4-1-1-0241-14 от 08.10.2014 г. | |
| Рабочая документация: | Выполнена полностью | |


| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполнено (да/нет) |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Канализация: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Водосток: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Газоснабжение: | Не требовалось | Не требовалось | Не требовалось |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получены | Оплачены | Подключено |


Генеральный подрядчик: ООО «Строительная Компания «ТехСтройИнвест» (ИНН 7720779418, ОГРН 1137746317279) Технический заказчик: ООО «Латурстрой» (ИНН 7719433180, ОГРН 5157746152328)


Храм преподобного Андрея Рублева


(освящен 30.09.2020)










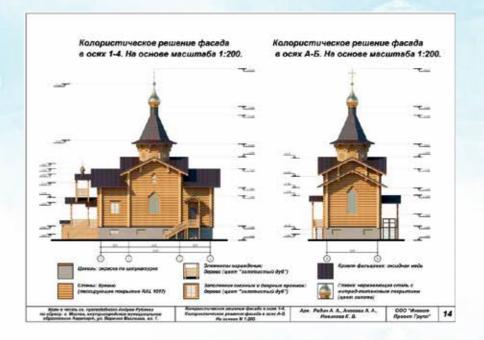

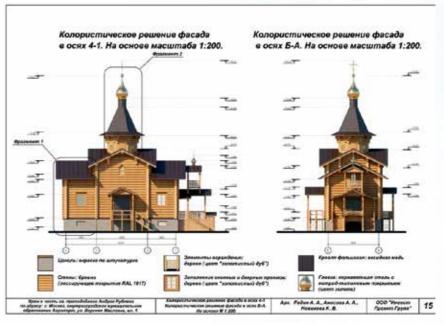

Архитектор: А.А. Радин

Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 140 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Площадь участка | 1500 м² |
| 2 | Площадь застройки храма | $162,8 \text{ m}^2$ |
| 3 | Общая площадь здания | $198,08 \text{ m}^2$ |
| 4 | - надземная часть | $107,76 \text{ m}^2$ |
| 5 | - подземная часть | $90,32 \text{ m}^2$ |
| 6 | Полезная площадь | 196,08 м ² |
| 7 | Строительный объем | 1200 м³ |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Верхняя отметка до верха креста | 21,25 |


| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200 | |
|--|--|
| Наименование храма | Храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке |
| Настоятель | протоиерей Владимир Леонов |
| Дата назначения настоятеля: | 26.01.2005 |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 1 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 1А |
| Округ | Северный |
| Район | Аэропорт |
| Численность населения района (приблизительно) | 75 000 чел. |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 4 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 1,4 км (р-н Савеловский) |
| - с востока | 1,4 км (р-н Тверской) |
| - с юга | 1,2 км (р-н Тверской) |
| - с запада | 1,0 км (р-н Аэропорт) |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 100 чел. |
| Площадь участка | 0,15 ra |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | Участок передан в безвозмездное пользование ФХУ на 9 лет до 18.11.2024 |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм не установлен |
| Год начала строительства основного храма | 2015 r. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | PC получено, срок действия с 10.01.2020 г. до 10.07.2020 г. |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 120 чел. |
| - верхнего храма | 120 чел. |
| - нижнего храма | - |
| Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) | Строительство завершено |
| Выполненные работы | Выполнена проектная и рабочая документация, храм построен и введен в эксплуатацию, освящен великим чином |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - |
| - Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | |
| Срок ввода в эксплуатацию | февраль 2020 г. |
| Срок подготовки к Великому освящению | 30 сентября 2020 г. |
| Примечания | С 2016 г. богослужения в строящемся храме не прекращались |


| Сведения о проекте и инженерных сетях | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Архитектор (ФИО): | Радин А.А. | | | |
| Разработчик АГР: | ООО «ИнвестПроектГруг | пп» (7706771400) | | |
| Год разработки АГР: | 2018 г. | | | |
| Проектировщик: | ООО «ИнвестПроектГрупп» (7706771400), СРО: СОЮЗ ИТП, Ассоциация Архитектурное Наследие, АС «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» | | | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном объ | еме | | |
| Экспертная организация: | 5030067450 OOO APΓO | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 77-2-1-3-018236-2019 от 17.07.2019 г. | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена полностью | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не получены | Не оплачены | Не подключено |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Канализация: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Водосток: | Не получены | Не оплачены | Не подключено |
| | Газоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получены | Оплачены | Подключено |


Генеральный подрядчик: ПСН Групп, ИП Давыдов Денис Александрович (ИНН 501305726995, на текущий момент ИП прекратил свою деятельность)
Технический заказчик: ООО «Контакт» (ИНН 7724534360, ликвидировано 01.06.2023)


Храм Царственных страстотерпцев

(освящен 31.07.2021)

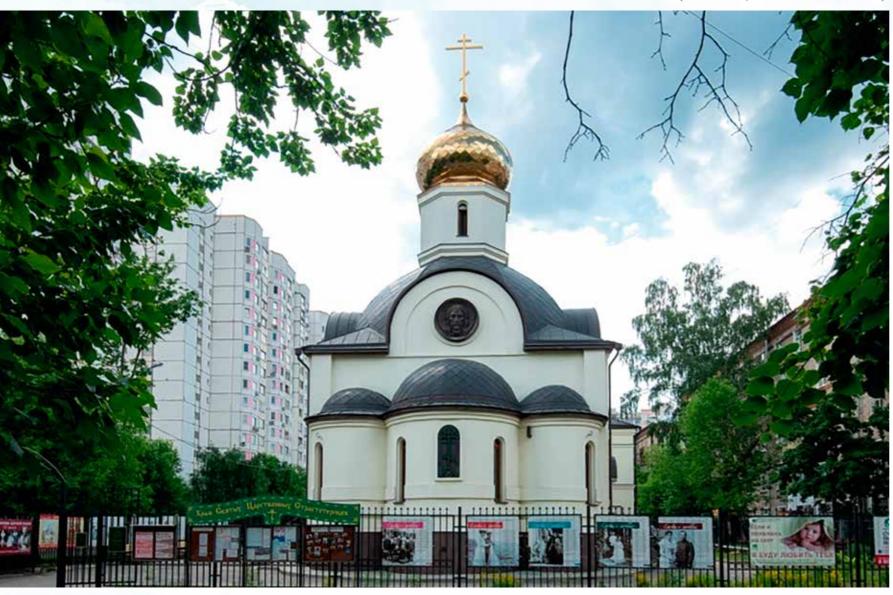

















Архитектор: Г.Г. Скугарева Проектировщик: «Моспроект-3»

Вместимость: 200 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|---------------------------------|---|
| 1 | Площадь участка | 0,24 га |
| 2 | Площадь застройки | 499,4: храм — 271 , дом причта — $228,4$ м ² |
| 3 | Общая площадь здания | 996,8: храм — 383 , дом причта — $613,8$ м ² |
| 4 | - надземная часть | Храм: 204, дом причта: 463 м² |
| 5 | - подземная часть | Храм: 179, дом причта: 150,8 м ² |
| 6 | Строительный объем | Храм: 2900, дом причта: 2553,4 м ³ |
| 7 | - подземная часть | Храм: 660, дом причта: 660 м ³ |
| 8 | - надземная часть | Храм: 2240, дом причта: 1893,4 |
| 9 | Этажность | Храм: 1+подвал+хоры, Дом причта:2+подвал |
| 10 | Верхняя отметка до верха креста | 21,25 |


| Наименование храма | Храм святых Царственных страстотерпцев в Войковском районе |
|--|---|
| Настоятель | протоиерей Сергий Стрекалин |
| Дата назначения настоятеля | 30.12.2011 |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 2 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| | 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., 5А |
| Адрес храма | - |
| Округ | Северный Войковский |
| Район | |
| Численность населения района (приблизительно) | 70 000 чел. |
| Количество храмов в районе (с учетом строящегося) | 2 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 4 KM |
| - с востока | 2 км |
| - с юга | 6 км |
| - с запада | 6 км |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни: | 70 чел. |
| Площадь участка: | 2400 кв.м |
| Собственник участка (ФХУ / Приход): | Приход |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм не установлен |
| Год начала строительства основного храма | 2012 г. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | РС № RU77118000-006787 от 03.04.2012 до 31.07.2018; № 77-118000-018403 2019 от 13.08.2019 |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 200 чел. |
| - верхнего храма | 200 чел. |
| - нижнего храма | - |
| Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) | Строительство завершено |
| Выполненные работы | Выполнена проектная и рабочая документация, возведен храм и приходской дом, подведены коммуникации, завершено благоустройство |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | Храм введен в эксплуатацию в 2019 г. |
| Срок подготовки к Великому освящению | Великое Освящение состоялось 31.07.2021 г. |
| Примечания | Дом причта введен в эксплуатацию на основании Решения арбитражного суда города Москвы № А-40-43816/2020-181-324 от 02.12.2020 как самовольно возведенное нежилое административно-хозяйственное строение |

| Сведения о проекте и инженерных сетя | x | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Архитектор (ФИО): | Скугарева Г.Г. | Скугарева Г.Г. | | | |
| Разработчик АГР: | АО «Моспроект-3» (ИН | H 7707820890) | | | |
| Год разработки АГР: | 2017 г. | | | | |
| Проектировщик: | АО «Моспроект-3» (ИН | H 7707820890) | | | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном об | ъеме | | | |
| Экспертная организация: | По храму экспертиза не проводилась, здание дома причта введено в эксплуатацию по решению арбитражного суда | | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | - | | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена частично | | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) | |
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачено | Подключено | |
| | Теплоснабжение: | Получены | Оплачено | Подключено | |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачено | Подключено | |
| | Канализация: | Получены | Оплачено | Подключено | |
| | Водосток: | Получены | Оплачено | Подключено | |
| | | | ** | *** | |
| | Газоснабжение: | Не получены | Не оплачено | Не подлючено | |

Генеральный подрядчик: 01.04.2013 - 2014 OOO «Строй-Трест», с 09.01.2019 - OOO «ИнвестПроектГрупп» (7706771400, СРО 3702 от 19.04.17); Технический заказчик: ГУП «УриРУО»

Храм 12 апостолов


(освящен 11.12.2021)

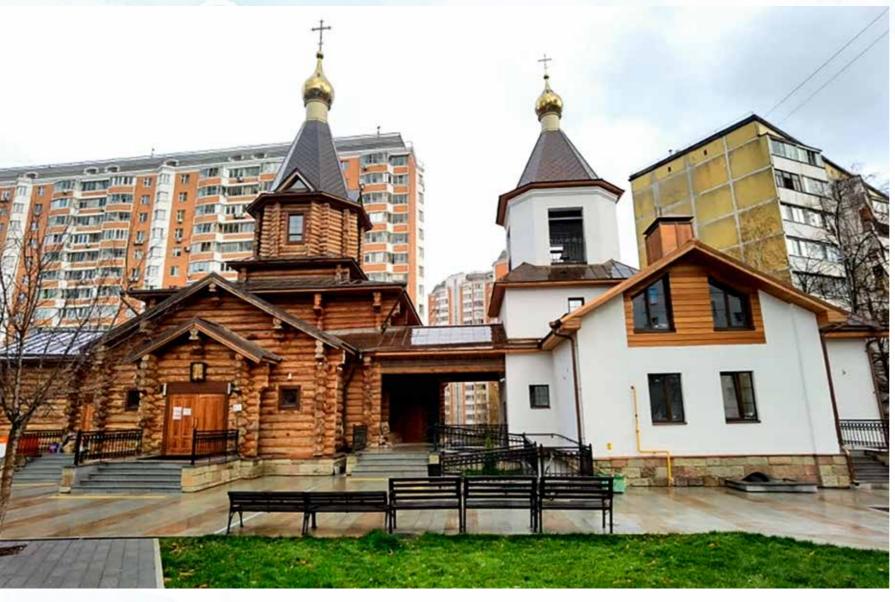







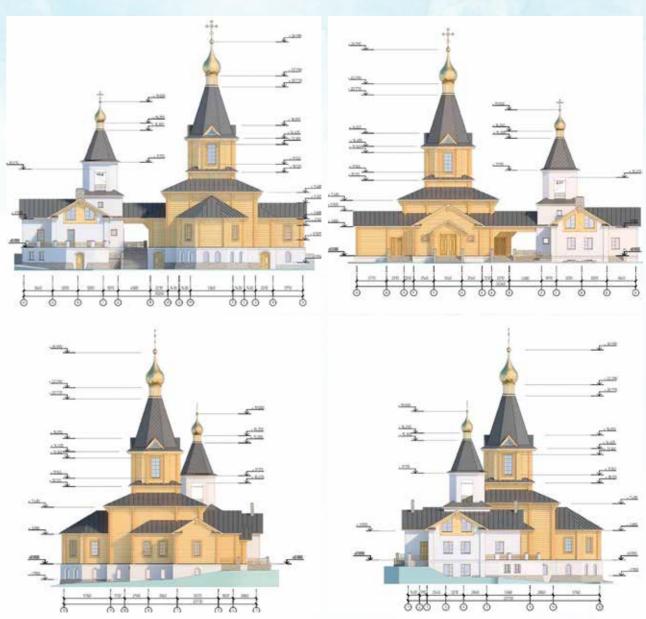

Архитекторы: А.А. Радин, И.Ю. Радина, И.В. Кортунова Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 250 человек

| Наименование показателя Площадь участка Площадь застройки | Величина 1605 м2 |
|---|---|
| | |
| Ілошаль застройки | (00 0 |
| 1.71 | 609 м2 |
| Общая площадь здания | 931,49 м2 |
| надземная часть | 425,15 м2 |
| подземная часть | 427,32 м2 |
| площадь открытых планировочных эле- ментов | 78,59 м2 |
| Суммарная поэтажная площадь в габаритах пружных стен | 935,6 м2 |
| Этажность | 1+подземный+технический чердак |
| Верхняя отметка до верха креста | 32,7 (до яблока — 29,65) м |
|) 10 10 12 12 | бщая площадь здания надземная часть подземная часть площадь открытых планировочных эле- ентов уммарная поэтажная площадь в габаритах аружных стен |


| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программ | |
|--|---|
| Наименование храма | Храм двенадцати апостолов в Ховрине |
| Настоятель | иерей Илия Боярский |
| Дата назначения настоятеля | 09.03.2015 r. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 2 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, ул. Клинская, вл. 12-14 |
| Округ | Северный административный округ |
| Район | Ховрино |
| Численность населения района (приблизительно) | 93 029 чел. |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 10 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 1,9 км (в другом районе через шоссе) |
| - с востока | 2,4 км |
| - с юга | 2,9 км (в другом районе через трассу) |
| - с запада | 2,5 км (в другом районе через шоссе) |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 200 чел. |
| Площадь участка | 0,1605 ra |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии) | Храм построен |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Отсутствует |
| Год начала строительства основного храма | 2017 r. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | PC получено, срок действия с 14.11.2017 г. до 14.11.2021 г. |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 250 чел. По проекту 49 чел. |
| - верхнего храма | 150 чел. |
| - нижнего храма | 100 чел. |
| Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) | Храм введен в эксплуатацию 2021 г. |
| Выполненные работы | Выполнена проектная и рабочая документация, возведены стены, своды кровля, установлены купола и кресты, подведены сети, выполнено благо устройство территории |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | Введен в 2021 г. |
| Срок подготовки к Великому освящению | Великое освящение было совершено 11.12.2021 г. |
| Примечания | С 2015 г. богослужения в строящемся храме не прекращались |

| Сведения о проекте и инженерных сетя | X | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Архитектор (ФИО): | Радин А.А., Радина И.Ю., Кортунова И.В. | | | |
| Разработчик АГР: | ООО «ИнвестПроектГру | ипп» (7706771400) | | |
| Год разработки АГР: | 2017 г. | | | |
| Проектировщик: | ООО «ИнвестПроектГру | ипп» (7706771400) | | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном обт | ьеме | | |
| Экспертная организация: | Экспертиза не проводил | ась | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | - | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена полностью | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не получено | Не оплачено | Не подключено |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Канализация: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Водосток: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Газоснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получено | Оплачено | Подключено |

| Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК) | |
|---|--|
| Наименование организации: | ООО «ИнвестПроектГрупп» (ИНН 7706771400, ОГРН 1127746216630) |
| Меняется ли на текущем этапе | нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 27.03.2012 г. |
| Уставный капитал: | 100 тыс. руб. |
| Численность сотрудников: | 8 чел. |
| Чистая прибыль в 2021 г.: | Убыток 229 тыс. руб. |
| Участие в СРО: | «Союз «Инновационные технологии проектирования» Рег. номер в реесте № 223 от 28.06.2017 г. |
| Основные виды деятельности компании: | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Число судебных дел за последние 3 года: | - |
| Примечания: | - |


| Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК) | |
|--|--|
| Наименование организации: | ООО ССК проект (ИНН 7717690230, ОГРН 5107746053751) |
| Меняется ли на текущем этапе | нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 23.12.2010 |
| Уставный капитал: | 11 000 py6. |
| Численность сотрудников: | 16 чел. |
| Прибыль в 2021 г.: | Убыток 37 тыс. |
| Участие в СРО: | СРО № 294 от 07.08.2018 г. Ассоциация «Саморегулируемая органи- зация Гильдия архитекторов и проектировщиков» |
| Основные виды деятельности компании: | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| Число судебных дел за последние 3 года: | |
| Примечания: | |


Храм преподобного Серафима Саровского

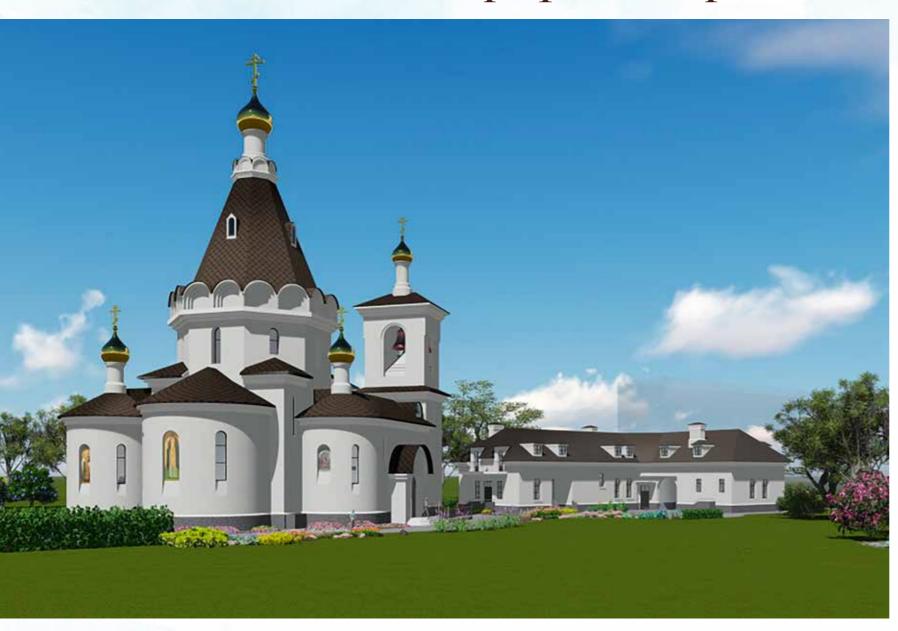







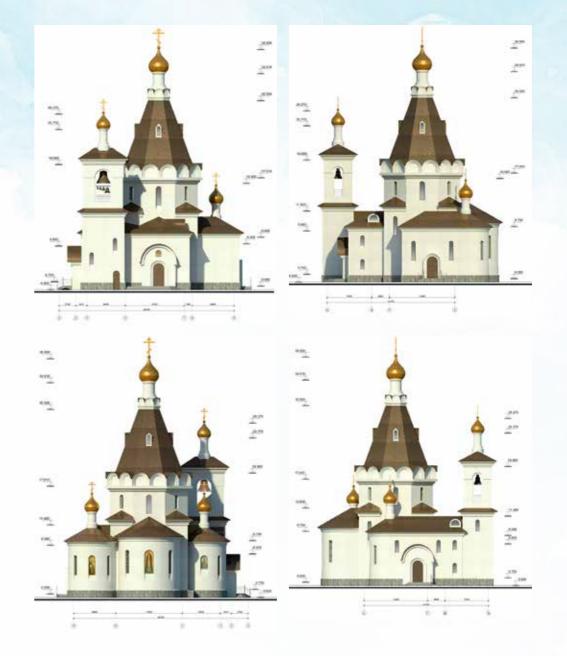

Архитектор: Н.Ю. Хрусталева

Вместимость: 500 человек


| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|---|--------------------|
| 1 | Площадь участка | 0,25 га |
| 2 | Площадь застройки храма | 630 m^2 |
| 3 | Общая площадь храма | 1144 m^2 |
| 4 | - надземная часть | 641 m^2 |
| 5 | - подземная часть | 503 M^2 |
| 6 | Строительный объем | 9923 m^3 |
| 7 | - надземная часть | 7857 m^3 |
| 8 | - подземная часть | 2066 m^3 |
| 9 | Суммарная поэтажная площадь храма в габаритах наружных стен | 697 м ² |
| 10 | Этажность | 3+подвал |
| 11 | Верхняя отметка | 38,9 м |

| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Програмы | |
|--|--|
| Наименование храма | Храм преподобного Серафима Саровского в Дегунино |
| Настоятель | иерей Виктор Герасимов |
| Дата назначения настоятеля | 15.09.2014 г. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 2 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, ул. Дубнинская, вл. 24 |
| Округ | Северный |
| Район | Восточное Дегунино |
| Численность населения района (приблизительно) | 84 496 чел. |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 1 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 0,5 км (строящийся храм в другом районе через дорогу или 30 км, в другом районе через МКАД) |
| - с востока | 3 км (в другом районе через трассу и железную дорогу) |
| - с юга | 4 км (в другом районе через дорогу) |
| - с запада | 5 км (в другом районе через шоссе) |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | в среднем 150 чел. |
| Площадь участка | 0,2466 га (под строительство); 0,0486 га (под благоустройство) |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - |
| Год начала строительства основного храма | 2016 г. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с по) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | Разрешение на строительство храма закончилось в 2022 г. Разрешение на строительство дома причта не получено |
| Вместимость храма | 530 чел. верхний – 350 чел., нижний – 180 чел. |
| Текущая стадия строительства | Храм построен |
| Выполненные работы | Оформлена проектная и рабочая документация; Храм возведен; Проложены инженерные сети; Благоустройство территории выполнено частично |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | |
| Срок подготовки к Великому освящению | 2024 г. |
| Примечания | С 27.12.2014 г. богослужения в строящемся храме не прекращались, а с 202 г. начались богослужения в построенном храме. Планируется строительство дома причта |


| Сведения о проекте и инженерных сетях | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|--|
| Архитектор (ФИО): | Хрусталева Н.Ю. | | | | |
| Разработчик АГР: | «Арх Проект-2» (7704660 | 912000) | | | |
| Год разработки АГР: | 2017 г. | | | | |
| Проектировщик: | «Арх Проект-2» (77046609 ров» выписка № 77046609 | «Арх Проект-2» (7704660912) и СРО ООО - член СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» выписка № 7704660912-20221114-1503 от 14.11.2022 | | | |
| Проектная документация: | По храму и дому причта н | выполнена полностью | | | |
| Экспертная организация: | ООО «Мосэксперт» | | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | №77-2-1-3-0137-17 от 27.09.2017г. Корректировка 2 очереди строительства: №77-2-1-3-003427-2023 от 27.01.2023 | | | | |
| Рабочая документация: | По храму выполнена полі | ностью, по дому причта ч | настично | A | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выпол- нено | |
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено | |
| | Теплоснабжение: | Получены 6,0 млн руб. | Оплачены частично 4,4 млн руб. (73,0%) | Не требуется | |
| Подключение к сетям дома причта: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено | |
| | Канализация: | Получены | Не оплачены | Не подключено | |
| | Водосток: | Получены | Не оплачены | Не подключено | |
| | Газоснабжение: | Не требовалось | Не оплачены | Не подключено | |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получены | - | Подключено | |


Генеральный подрядчик (по храму): ООО «Приоритет» (ИНН 9717089834) Технический заказчик (по храму): ООО «Оргстройпроект» (ИНН 7709647489)


Храм святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

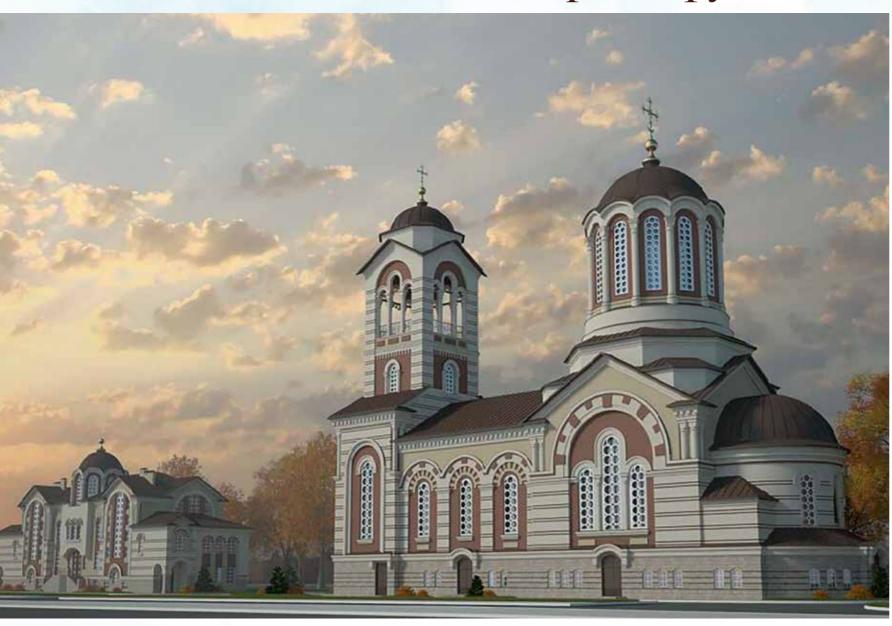




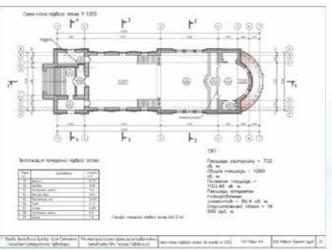











Архитекторы: О.А. Баранникова, А.А. Радин Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 800-1000 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Площадь застройки храма/дома причта | 733/579 m ² |
| 2 | Общая площадь храма/дома причта | $1260/1304 \text{ m}^2$ |
| 3 | Полезная площадь храма/дома причта | $1120/1227 \text{ m}^2$ |
| 4 | Строительный объем храма/дома причта | $16\ 000/7200\ \mathrm{m}^3$ |
| 5 | Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен храма/дома причта | 1484/1311 м² |
| 6 | Верхняя отметка храма до подкрестного яблока/дома причта | 41,4/19,9 м |

| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200 | |
|--|--|
| Наименование храма | Храм святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, Чудо творца в Коптево |
| Настоятель | протоиерей Сергий Дикий |
| Дата назначения настоятеля | 05.06.2012 r. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 3 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, ул. Большая Академическая, 33 |
| Округ | CAO |
| Район | Коптево |
| Численность населения района (приблизительно) | 100 645 чел. |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 2 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 6,4 км (в другом районе за шоссе) |
| - с востока | 4,8 км |
| - с юга | 4,5 км (в другом районе за железной дорогой) |
| - с запада | 2,4 км |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 200-250 чел. |
| Площадь участка | 0,7581 га |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | Приход |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | - |
| Год начала строительства основного храма | 2016 г. |
| Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | РС № 77-138000-018260-2019, срок действия до 13.12.2022 г. |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 1000 чел. |
| - верхнего храма | 1000 чел. |
| - нижнего храма | - |
| Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) | Храм сдан в эксплуатацию |
| Выполненные работы | Выполнена проектная и рабочая документация, возведены х и духовно-просветительский центр, подведены коммуникац завершено благоустройство |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - |
| Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | 06.04.2023 |
| Срок подготовки к Великому освящению | Декабрь 2023 г. |
| Примечания | |


| Сведения о проекте и инженерных сет | Сведения о проекте и инженерных сетях | | |
|---|--|--|--|
| Архитектор (ФИО): | Баранникова О.А., Радин А.А. | | |
| Разработчик АГР: | ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400) | | |
| Год разработки АГР: | 2017 | | |
| Проектировщик: | ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400) | | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном объеме | | |
| Экспертная организация: | ООО «Экспертиза и Консультирование» | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 77-2-1-3-0424-17 от 17.05.2017 | | |
| Рабочая документация: | Выполнена в полном объеме | | |


| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполнено (да/нет) |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не требовалось | Не требовалось | Отопление от газовой котельной |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Канализация: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Водосток: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Газоснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получены | Оплачены | Подключено |


| Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК) | |
|---|--|
| Наименование организации: | ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ ГРУПП», (ИНН 7706771400 / ОГРН 1127746216630) |
| Меняется ли на текущем этапе | нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 27.03.2012 |
| Уставный капитал: | 100 000 руб. |
| Численность сотрудников: | 9 |
| Чистая прибыль в 2021 г.: | - 229 (убытки) |
| Участие в СРО: | СРО АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЮ НА- ЦИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕ- ДИЕ» на строительство Уровень ответственности до 500 млн руб. СРО СОЮЗ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на проектирование Уровень ответственности до 25 млн руб. СРО АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» на изыскания Уровень ответственности до 25 млн руб. |
| Основные виды деятельности компании: | Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) |
| Число судебных дел за последние 3 года: | Нет |
| Примечания: | - |


| Сведения о техническом заказчике (по отчету CI | IAPK) |
|--|--|
| Наименование организации: | ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230, ОГРН 5107746053751) |
| Меняется ли на текущем этапе | Нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | Не менялся |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 23 декабря 2010 г. |
| Уставный капитал: | 11 000,00 руб. |
| Численность сотрудников: | 16 чел. |
| Прибыль в 2021 г.: | 423 000 руб. |
| Участие в СРО: | СРО № 294 от 07.08.2018 г. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и проектировщиков» |
| Основные виды деятельности компании: | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| Число судебных дел за последние 3 года: | |
| Примечания: | |


Храм блаженной Ксении Петербургской

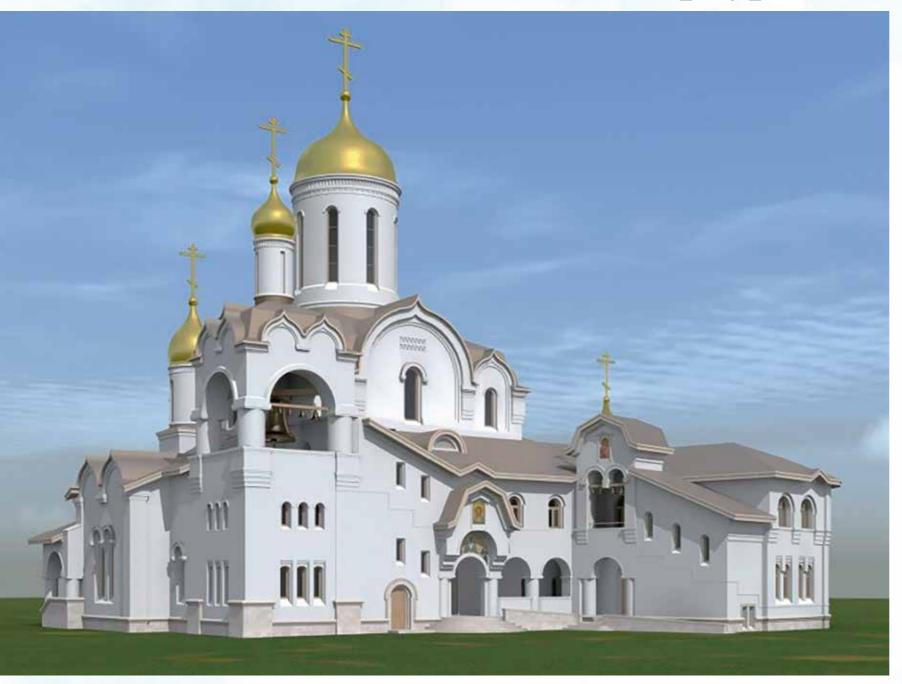












Архитектор: С.В. Борисов

Проектировщики: ООО «Рест-мастер»,

OOO «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 500 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|---|-----------------------|
| 1 | Площадь участка | 2900 м2 |
| 2 | Площадь застройки храма | 879,34 м ² |
| 3 | Общая площадь храма | $1756,74 \text{ m}^2$ |
| 4 | - подземная часть | $731,43 \text{ m}^2$ |
| 5 | - надземная часть | $1025,31 \text{ m}^2$ |
| 6 | Строительный объем | 9765 m^3 |
| 7 | - подземная часть | 2195 m^3 |
| 8 | - надземная часть | 7570 m^3 |
| 9 | Суммарная поэтажная площадь храма в габаритах наружных стен | 697 m ² |
| 10 | Этажность | 1+подземный |
| 11 | Высота здания до креста/до верха креста | 31,2/35,3 м |

| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программ | |
|---|--|
| | Храм блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове |
| Настоятель | иерей Михаил Кузелев |
| Д ата назначения настоятеля | С 20.11.2018 - и.о. настоятеля; с 16.11.2021 - настоятель |
| Иисло священников в храме (кроме настоятеля) | 1 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, Бескудниковский проезд, вл. 4 |
| Округ | CAO |
| ^р айон | Бескудниково |
| Нисленность населения района (приблизительно) | 89 000 чел. |
| Соличество храмов в районе(с учетом строящегося) | 2 |
| удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 1,75 км (в другом районе через шоссе) |
| - с востока | 0,5 км (в другом районе через дорогу) |
| - с юга | 2,22 км (в другом районе через шоссе) |
| - с запада | 1,74 км |
| Соличество причастников в воскресные и праздничные дни | До 150 чел. |
| Ілощадь участка | 0,27 га |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные на- строения, наличие на участке городских коммуникаций, близких рунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.) | |
| Наличие временного храма / в честь кого / вместимость | Временный храм демонтирован |
| од начала строительства основного храма | 2021 г. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | РС получено |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 500 чел. |
| верхнего храма | 500 чел. |
| нижнего храма | - |
| Гекущая стадия строительства / процент готовности(стадии) | Отделочные работы, внутренние инженерные системы, благоустройство территории по храмовому комплексу (готовность 75%) |
| Выполненные работы | - Оформлена проектная и рабочая документация; - Построено здание храма; - Завершены кровельные работы; - Ведется прокладка наружных инженерных коммуникаций |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - Устройство внутренних инженерных систем в здании храма (ВК, ОВ, ЭОМ, СС); - Фасады (окна, двери, цоколь); - Отделочные работы (стяжки, штукатурка, шватлевка, окраска, плитка) - Монтаж теплогенераторной; - Пусконаладочные работы и комплексные испытания систем; - Молниезащита здания; - Прокладка наружного газопровода |
| Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | июль 2024 г. |
| Срок подготовки к Великому освящению | 4 квартал 2024 г. |
| Тримечания | |

| Примечания | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Сведения о проекте и инженерных сетях | | |
| Архитектор (ФИО): | Борисов С.В. | |
| Разработчик АГР: | ООО «Рест-мастер» (ИНН 7719405947) | |
| Год разработки АГР: | 2017 г. | |
| Проектировщик: | ООО «Инвест Проект Групп», ИНН (7706771400) | |
| Проектная документация: | Выполнена в полном объеме | |


| Экспертная организация: Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | | ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ» № 77-2-1-3-0128-18 от 17.07.2018 | | |
|---|-------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не получены | Не оплачены | Не подключено |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | В работе |
| | Канализация: | Получены | Оплачены | В работе |
| | Водосток: | Получены | Оплачены | В работе |
| | Газоснабжение: | Получены | Оплачены | В работе |
| | ГО ЧС и ПБ: | Не получены | Не оплачены | В работе |


| 10 10 1121 | The monty terms The entrained D pure terms |
|---|---|
| Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК) | |
| Наименование организации: | ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ ГРУПП», (ИНН 7706771400 / ОГРН 1127746216630) |
| Меняется ли на текущем этапе | нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 27.03.2012 |
| Уставный капитал: | 100 000 руб. |
| Численность сотрудников: | 9 |
| Чистая прибыль в 2021 г.: | - 229 (убытки) |
| Участие в СРО: | СРО АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» на строительство Уровень ответственности до 500 млн руб. СРО СОЮЗ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на проектирование Уровень ответственности до 25 млн руб. СРО АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» на изыскания Уровень ответственности до 25 млн руб. |
| Основные виды деятельности компании: | Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) |
| Число судебных дел за последние 3 года: | Нет |
| Примечания: | - |


| Сведения о техническом заказчике (по отчету С | СПАРК) |
|---|---|
| Наименование организации: | ООО «ЛатурСтрой» (ИНН 7719433180 ОГРН 5157746152328) |
| Меняется ли на текущем этапе | Нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 09.12.2015 |
| Уставный капитал: | 10 000 руб. |
| Численность сотрудников: | 5 |
| Прибыль в 2021 г.: | 1 505 000 руб. |
| Участие в СРО: | СРО АССОЦИАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» на строительство Уровень ответственности до 60 млн руб. СРО АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АР-ХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на проектирование Уровень ответственности на 25 млн руб. |
| Основные виды деятельности компании: | Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) |
| Число судебных дел за последние 3 года: | 4 |
| Примечания: | - (6) |


Храм праведного воина Феодора Ушакова




















Архитектор: А.А. Радин

Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 500 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|--|---------------------------|
| 1 | Площадь участка | 7349 м ² |
| 2 | Площадь застройки | 1320 м ² |
| 3 | Общая площадь здания | 2015,56 м ² |
| 4 | - полезная площадь | 1681,98 м ² |
| 5 | - площадь открытых планировочных элементов | 95,99 м ² |
| 6 | - надземная часть | 1532,01 м ² |
| 7 | - подземная часть | $483,55 \text{ M}^2$ |
| 8 | Строительный объем | 17 500 м ³ |
| 9 | Этажность | 2+подвал+технический этаж |
| 10 | Высота здания до центра подкрестного шара | 23,415 м |


| Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся п | ю Программе 200 |
|--|--|
| Наименование храма | Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном |
| Настоятель | протоиерей Александр Коробейник |
| Дата назначения настоятеля | 24 декабря 2016 г. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 0 |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 59 |
| Округ | Северный административный округ |
| Район | Левобережный район |
| Численность населения района (приблизительно) | 55,355 чел. |
| Количество храмов в районе (с учетом строящегося) | 3 храма Знаменского благочиния |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 3 км (через шоссе) |
| - с востока | 1,6 км (через шоссе) |
| - с юга | 1,78 км (через канал) |
| - с запада | 2,79 км (через канал) |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | До 40 чел. |
| Площадь участка | 7693 кв.м |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ МП |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | Дефицит финансирования |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм в честь святого праведного воина Феодора Ушакова, вместимость: 100 чел. |
| Год начала строительства основного храма | 01.01.2018г. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожида- ется к [дата] / или Разрешение не получено | Разрешение выдано 13.04.2023г. № 77-09-020800-2023, срок действия: с 19.01.2023 по 13.04.2024 г. |
| Вместимость строящегося храма, всего | 620 чел. |
| - верхнего храма | 500 чел. |
| - нижнего храма | 120 чел. |
| Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) | Строительство нулевого цикла (цоколя) (готовность 60%) |
| Выполненные работы | Оформлена проектная и рабочая документация;Выполнены работы по цоколю |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | - Возведение стен, монтаж кровли, отделочные работы по храму, прокладка инженер ных сетей |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | Дефицит финансирования |
| Срок ввода в эксплуатацию | Не установлен |
| Срок подготовки к Великому освящению | Не определен |
| Примечания | С 2016 г. богослужения ведутся во временном храме |
| Сведения о проекте и инженерных сетях | |
| Архитектор (ФИО): | Радин А.А. |
| Разработчик АГР: | ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН: 7706771400) |
| 1 | 2020 г. |
| Год разработки АГР: | |

| Проектная документация: | Выполнена в полном объеме | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Экспертная организация: | ООО «Экспертиза и Консультирование» | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 77-2-1-3-032420-2020 от 21 июля 2020 г. | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена полностью | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.усло- вий | Подключение вы- полнено (да/нет) |
| Подключение к сетям: | Электроснабжение: | Получено | Оплачено | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| | Водоснабжение: | Получено | Оплачено | Не подключено |
| | Канализация: | Получено | Оплачено | Не подключено |
| | Водосток: | Получено | Оплачено | Не подключено |
| | Газоснабжение: | Получено | Оплачено | Не подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получено | Оплачено | Не подключено |


| Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК) | |
|---|---|
| Наименование организации: | ООО «МАНГАЗЕЯ» (ИНН 7704808608; ОГРН 1127746418590) |
| Меняется ли на текущем этапе | Нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 30.05.2012 r. |
| Уставный капитал: | 620 000 000 py6. |
| Численность сотрудников (2022г): | 63 чел. |
| Чистая прибыль в 2022 г.: | 2 930 747 000 руб. |
| Участие в СРО: | |
| Основные виды деятельности компании: | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Число судебных дел за последние 3 года: | - |
| Примечания: | - |


| Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРН | () | | |
|---|--|--|--|
| Наименование организации: | ООО «ИСК «Арсенал-Холдинг» (ИНН 7723786251; ОГРН 1117746060783) | | |
| Меняется ли на текущем этапе | Нет | | |
| Если меняется, кто был предыдущим | - | | |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 02.02.2011 г. | | |
| Уставный капитал: | 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. | | |
| Численность сотрудников (2022г.): | 10 чел. | | |
| Чистая прибыль в 2022 г.: | 375 000 руб. | | |
| Участие в СРО: | - рег.номер от 28.10.2016г. № СРО-С-060-05112009 в реестре Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Объединение организаций, осуществляющих Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»; - рег. номер от 11.04.2018 г. г. № СРО-П-019-26082009 в реестре Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» - рег.номер от 10.04.2018 г. г. № СРО-И-025-28012010 в реестре Ассоциации саморегулируемой организацией «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» | | |
| Основные виды деятельности компании: | 70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | | |
| Число судебных дел за последние 3 года: | | | |
| Примечания: | | | |


Храм праведного Алексия, пресвитера Московского

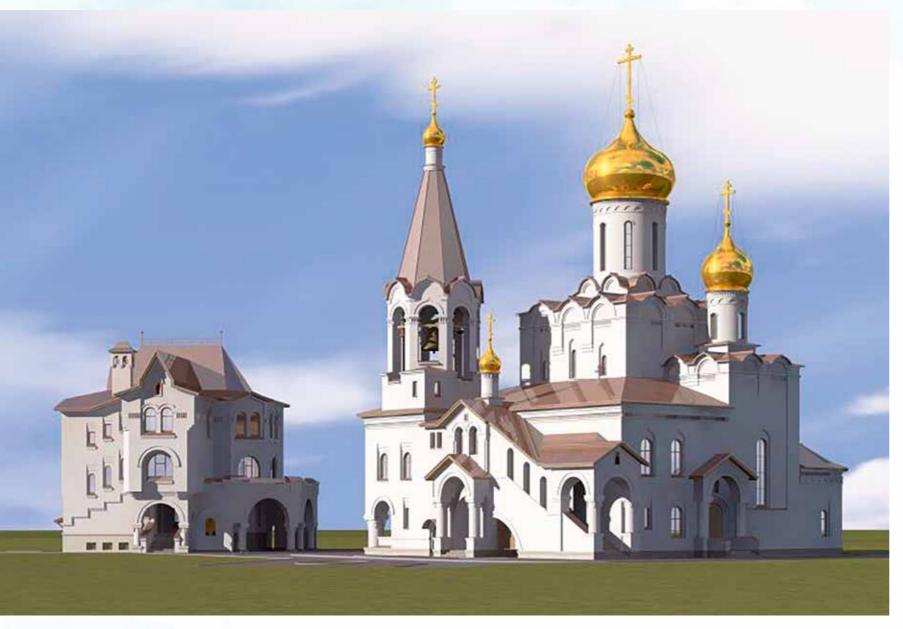







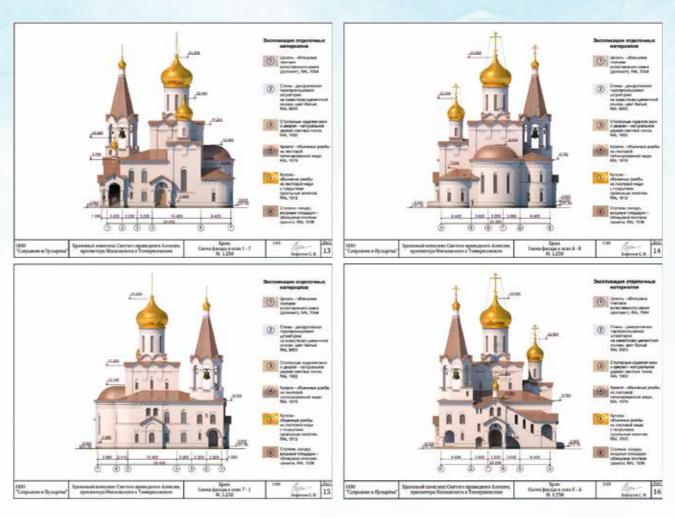

Архитекторы: С.В. Борисов, Ю.А. Белкина Проектировщик: НП «ЕСЗ МП»

Вместимость: 500 человек


| № п/п | Наименование показателя | Величина |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | Площадь участка | 3766 м² |
| 2 | Площадь застройки | 753 м ² |
| 3 | Общая площадь здания | 1746,37: храма — $1293,35$, дом причта — $453,02$ м ² |
| 4 | - подземная часть | Храм: 511,82, Дом причта: 88,28 м² |
| 5 | - надземная часть | Храм: 781,53, Дом причта: 364,74 м ² |
| 6 | Строительный объем | 11 705,4: храм — 9492, дом причта — 2213,4 м ³ |
| 7 | - подземная часть | Храм: 2240, Дом причта: 484,8 м ³ |
| 8 | - надземная часть | Храм: 7252, Дом причта: 1728,6 м ³ |
| 9 | Этажность | Храм: 2+подземный, Дом причта: 3+подземный |


| | Храм святого праведного Алексия, пресвитера Московского, в Тимиря- | |
|--|--|--|
| Наименование храма | зевском | |
| Настоятель | иерей Владимир Филиппов | |
| Дата назначения настоятеля | 29.12.2020 | |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | 0 | |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей | |
| Адрес храма | г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл. 1 | |
| Округ | Северный административный округ | |
| Район | Тимирязевский район | |
| Численность населения района (приблизительно) | 83 000 чел. | |
| Количество храмов в районе(с учетом строящегося) | 4 | |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | | |
| - с севера | 1,25 км (в другом районе через трассу) | |
| - с востока | 1,55 км (в другом районе через трассу) | |
| - с юга | 2,55 км (в другом районе через шоссе) | |
| - с запада | 1,55 км (через шоссе) | |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 30 чел. | |
| Площадь участка | 0,3766 га | |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата | |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.) | - | |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм святого праведного Алексия, пресвитера Московского вместимость: 70 чел. | |
| Год начала строительства основного храма | - | |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | РС не получено | |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 500 чел. | |
| - верхнего храма | 500 чел. | |
| - нижнего храма | - | |
| Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) | В стадии подготовки к строительству. | |
| Выполненные работы | - Оформлена проектная и частично рабочая документация | |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | Получение разрешения на строительство и все физические работы | |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | Дефицит финансирования | |
| Срок ввода в эксплуатацию | Не определен | |
| Срок подготовки к Великому освящению | Не определен | |
| Примечания | • | |


| Архитектор (ФИО): | Борисов С.В., Белкина Ю.А. | | | |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| Разработчик АГР: | ООО «Сапрыкин и Пузн | ООО «Сапрыкин и Пузырева» (ИНН 7705831470) | | |
| Год разработки АГР: | 2019 г. | 2019 г. | | |
| Проектировщик: | НП «Единая Служба Зан | казчика Московской Пат | риархии» (ИНН 772651255 | 55) |
| Проектная документация: | Выполнена в полном об | Выполнена в полном объеме | | |
| Экспертная организация: | OOO «CK PECYPC» | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | № 77-2-1-3-059241-2022 от 18.08.2022 г. | | | |
| Рабочая документация: | Выполнена частично | | | |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Не получено | | |
| | Теплоснабжение: | Не получено | | |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Не получено | | |
| | Канализация: | Не получено | | |
| | Водосток: | Не получено | | |
| | Газоснабжение: | Не получено | | |
| | ГО ЧС и ПБ: | Не получено | | |

Генеральный подрядчик и технический заказчик не определены.


Храм пророка Илии

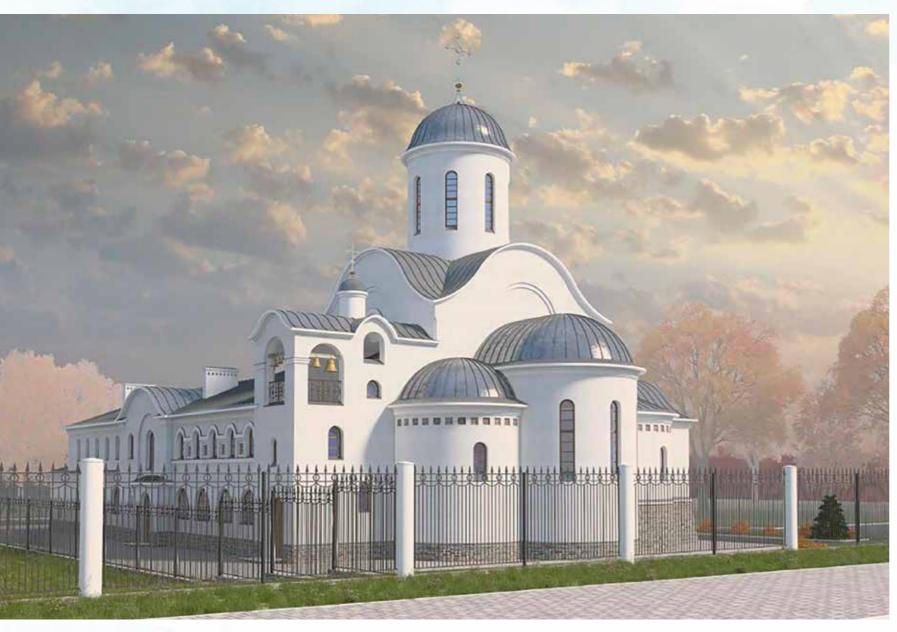







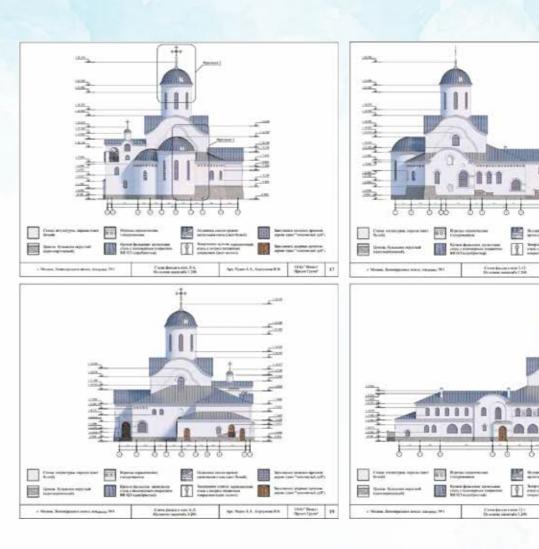

Архитекторы: А.А. Радин, И.В. Кортунова Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 500 человек

| № п/п | Наименование показателя | Величина | |
|-------|------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Площадь участка | 4913 м ² | |
| 2 | Площадь застройки | 1011,41 м ² | |
| 3 | Общая площадь здания | 1375,14 м ² | |
| 4 | - надземная часть | 1151,02 м ² | |
| 5 | - подземная часть | 224,12 м ² | |
| 6 | Строительный объем | 9322 M^3 | |
| 7 | - надземная часть | 8892 m³ | |
| 8 | - подземная часть | 430 м ³ | |
| 9 | Этажность | 2+подземный | |
| 10 | Высота до центра подкрестного шара | 29,25 | |

| Наименование храма | Храм пророка Илии в Головине |
|--|--|
| - | |
| Настоятель | протоиерей Димитрий Дмитриев |
| Дата назначения настоятеля | 11.03. 2013 r. |
| Число священников в храме (кроме настоятеля) | - |
| Викарий | архиепископ Егорьевский Матфей |
| Адрес храма | 123212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 |
| Округ | CAO |
| Район | Войковский |
| Численность населения района (приблизительно) | 70 499 чел. |
| Количество храмов в районе (с учетом строящегося) | 5 |
| Удаленность от ближайших храмов, км: | |
| - с севера | 4 км (в другом районе через шоссе) |
| - с востока | 6 км |
| - с юга | 5 км (в другом районе через трассу) |
| - с запада | 4 км (в другом районе через шоссе) |
| Количество причастников в воскресные и праздничные дни | 15-20 чел. |
| Площадь участка | 0,4913 га |
| Собственник участка (ФХУ / Приход) | ФХУ МП |
| Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.) | - |
| Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость | Временный храм в честь пророка Илии, вместимость: 70 чел. |
| Год начала строительства основного храма | Планируется начать строительство в 2023 г. |
| Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено | Не получено |
| Вместимость строящегося храма, всего: | 500 чел. |
| - верхнего храма | 500 чел. |
| - нижнего храма | - |
| Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) | Завершается проектирование |
| Выполненные работы | - Проектная документация проходит экспертизу |
| Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса | Завершить проектирование, получить разрешение на строительство выполнить физические работы |
| Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию | Сроки не определены |
| Срок подготовки к Великому освящению | Сроки не определены |
| | С 2013 г. богослужения во временном храме не прекращались |

| Сведения о проекте и инженерных се | гях | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Архитектор (ФИО): | Радин А.А., Кортунова И.В. | | | |
| Разработчик АГР: | ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400) | | | |
| Год разработки АГР: | 2019 г. | | | |
| Проектировщик: | ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400, СРО «Союз «Инновационные технологии проектирования» Рег. номер в реесте № 223 от 28.06.2017 г.) | | | |
| Проектная документация: | Выполнена частично: КР, ЭОМ, АР, СС, ТБЭ | | | |
| Экспертная организация: | ООО «Экспертиза и КО» (ИНН 7717780170) | | | |
| Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения): | В работе | | | |
| Рабочая документация: | В работе | | | - 1 |
| | Тип сети / Этапы | Получение тех. условий | Оплата тех.условий | Подключение выполне- но (да/нет) |
| | Электроснабжение: | Получены | Оплачены | Подключено |
| | Теплоснабжение: | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Подключение к сетям: | Водоснабжение: | Получены | Оплачены | Не подключено |
| | Канализация: | Получены | Оплачены | Не подключено |
| | Водосток: | Получены | Оплачены | Не подключено |
| | Газоснабжение: | Получены | Оплачены | Не подключено |
| | ГО ЧС и ПБ: | Получены | Не оплачены | Не подключено |

| Сведения о техническом заказчике на проектирование | е (по отчету СПАРК) |
|---|---|
| Наименование организации: ООО ССК-проект (ИНН 7717690230, ОГРН 5107746053751) | |
| Меняется ли на текущем этапе | Нет |
| Если меняется, кто был предыдущим | Не менялся |
| Дата регистрации в ЕГРЮЛ: | 23 декабря 2010 г. |
| Уставный капитал: | 11 000,00 руб. |
| Численность сотрудников: | 16 чел. |
| Прибыль в 2021 г.: | Убыток 37 тыс. |
| Участие в СРО: | СРО № 294 от 07.08.2018 г. Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» |
| Основные виды деятельности компании: | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| Число судебных дел за последние 3 года: | - |
| Примечания: | |

Генеральный подрядчик пока не определен.
