


ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, на Дубровке	93
Храм иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасовке	95
Храм мученицы Татианы Римской в Люблине	97
Храм благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском	99
Храм святителя Димитрия, митрополита Ростовского, на Рязанке	101
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Некрасовке	103
Храм Сретения Господня в Жулебине	105
Храм святого апостола Андрея Первозванного в Люблине	107
Храм святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьине	109
Храм Воскресения Словущего в Марьине	111
Храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Марьине	113
Храм мучеников Анатолия и Протолеона в Марьине	115
Храм праведного Симеона Верхотурского в Марьине	117
Храм Преображения Господня в Лефортове	119
Храм преподобного Паисия Святогорца на Самаркандском бульваре	121
Храм мученика Андрея Стратилата в Люблине	123
Храм Жен-Мироносиц в Марьине	125
Храм Курской-Коренной иконы Божией Матери в Вязовке	127
Храм преподобного Александра Свирского в Грайворонове	129

Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских


(освящен 13.12.2015)

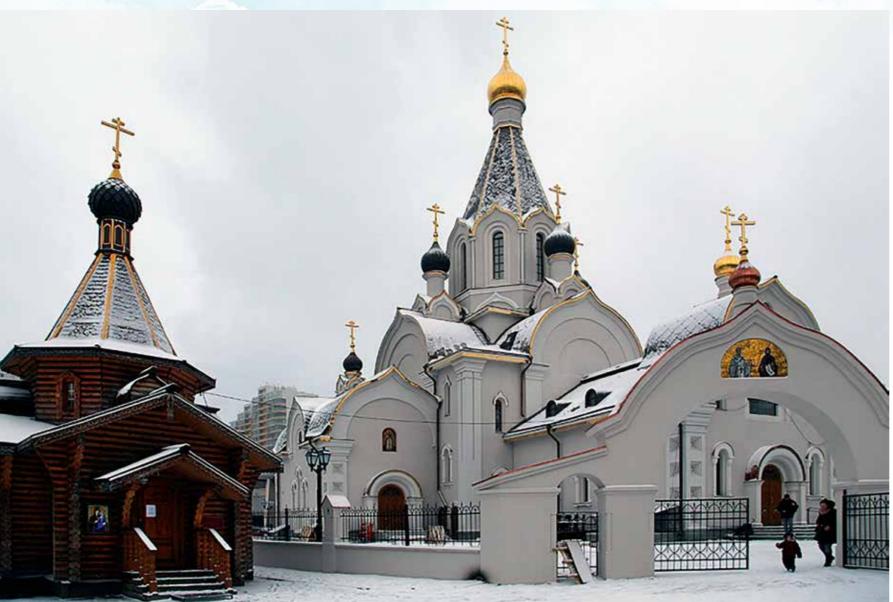







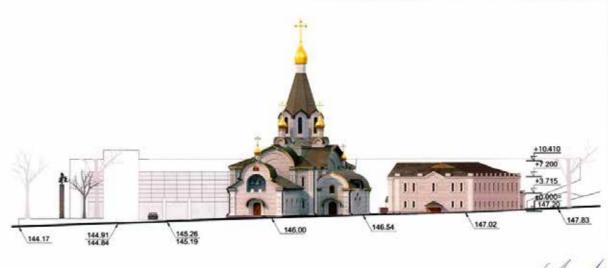

Архитектор: А.Н. Оболенский Проектировщик: «Моспроект-2»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	0,40 га
2	Площадь застройки, в том числе	1362 м ²
3	- храм	772 м ²
4	- дом причта	590 м ²
5	Общая площадь храма/дом причта	1404/1350 м ²
6	Строительный объем храма/дома причта	10 418/7347 м³
7	Верхняя отметка храма/дома причта	30/10,41 м
8	Этажность храма/дома причта	1-3+подклет/ 2+тех.чердак+подвал

	Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словен	
Наименование храма	ских, на Дубровке	
Настоятель	протоиерей Владимир Макеев	
Дата назначения настоятеля	2011 r.	
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-	
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей	
Адрес храма	г. Москва, ул. Мельникова, домовл. 9	
Округ	Юго-Восточный	
Район	Южнопортовый	
Численность населения района (приблизительно)	72 800 чел.	
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	9	
Удаленность от ближайших храмов, км:		
- с севера	0,8 км (в другом районе через шоссе)	
- с востока	1 км	
- с юга	1,5 км (в другом районе через трассу)	
- с запада	0,7 км (в другом районе через шоссе)	
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	90 чел.	
Площадь участка	0,4 га	
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход	
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Строительство завершено	
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь Иверской иконы Божией Матери, на 150 чел. был перенесен на другой участок	
Год начала строительства основного храма	2011 г.	
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС (№ RU77223000-006841) получено, срок действия с 16.04.2012 по 30.06.2014	
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.	
- верхнего храма	500 чел.	
- нижнего храма	-	
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Отделочные работы по дому причта (готовность 7%)	
Выполненные работы	Храм построен, установлены купола и кресты, выполнена внутренняя отделка, подведены сети, построено здание дома причта	
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	Отделочные работы по дому причта	
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	Храм сдан в эксплуатацию	
Срок ввода в эксплуатацию	12.11.2014 г.	
Срок подготовки к Великому освящению	Храм освящен 13 декабря 2015 г.	
Примечания	С 2014 г. богослужения в храме не прекращались	


Сведения о проекте и инженерных сетя	ıx			
Архитектор (ФИО):	Оболенский А.Н.			
Разработчик АГР:	ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина ИНН 7710966553, Свидетельство №П-4-15-1090 от 13 апреля 2015 г., СРО №095.01-2012-7710966553-И-003 от 19.08.2016.			
Год разработки АГР:	2011 г.			
Проектировщик:	ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина ИНН 7710966553, Свидетельство №П-4-15-1090 от 13 апреля 2015 г., СРО №095.01-2012-7710966553-И-003 от 19.08.2016.			
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ьеме		
Экспертная организация:	Мосгосэкспертиза			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	Получено в 2011 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Получены	Подключено


Генеральный подрядчик: ООО «ГК Ташир», ЗАО «Эко-Тепло» Технический заказчик: ГК «Высота»

Храм иконы Божией Матери «Воспитание»


(освящен 21.01.2018)


























Архитектор: А.А. Анисимов

Проектировщик: «Товарищество Реставраторов. Ма-

стерские Анисимова»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь застройки	525 м ²
2	Общая площадь объекта (суммарная поэтажная площадь)	1355 м ²
3	Строительный объем	5500 м ³
4	Высота храма до креста	19,3 м


Наименование храма	Храм иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасовке
Настоятель	протоиерей Алексий Пшеничников
Лата назначения настоятеля	10 октября 2022 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
* **	
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	111674, Москва, 1-я Вольская улица, дом 4 Юго-Восточный
Округ Район	Некрасовка
Численность населения района (приблизительно)	98 799 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	2
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	5 км
- с востока	6 км (в другом районе)
- с юга	5 км (в другом районе)
- с запада	4 км (в другом районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	От 60 до 150 чел.
Площадь участка	0,12 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь преподобного Сергия Радонежского, вместимость: 50 чел.
Год начала строительства основного храма	2010 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено: срок действия: с 29.10.2015 по 29.07.2016
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	350 чел.
- нижнего храма	150 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм построен
Выполненные работы	Стены и своды возведены, купола и кресты установлены, сети подведе ны, выполнена внешняя и внутренняя отделка
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	30.09.2017 г.
Срок подготовки к Великому освящению	21.01.2018 r.
Примечания	


Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Заслуженный архитектор России, председатель Правления Гильдии храмоздателей Анисимов А.А.			
Разработчик АГР:				
Год разработки АГР:	2010 г.	2010 г.		
Проектировщик:	Товарищество Реставраторо	в. Мастерские Анисимо	ова. ИНН 7716506383	
Проектная документация:	Выполнена полностью			
Экспертная организация:	-			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	-			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Выполнено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Выполнено
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Выполнено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Выполнено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Выполнено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Выполнено


Генеральный подрядчик: ООО «Товарищество реставраторов» (ИНН 7720588100, ОГРН 1077757455973) (2010-2012 гг.), АО «Трест МСМ-1» (ИНН 7731178063, ОГРН 1037739587159 (2012-2016гг.)
Технический заказчик: ООО «Мастерские Андрея Анисимова» (ИНН 7716506383, ОГРН 1047796260820)


Храм святой мученицы Татианы Римской


(освящен 09.12.2018)

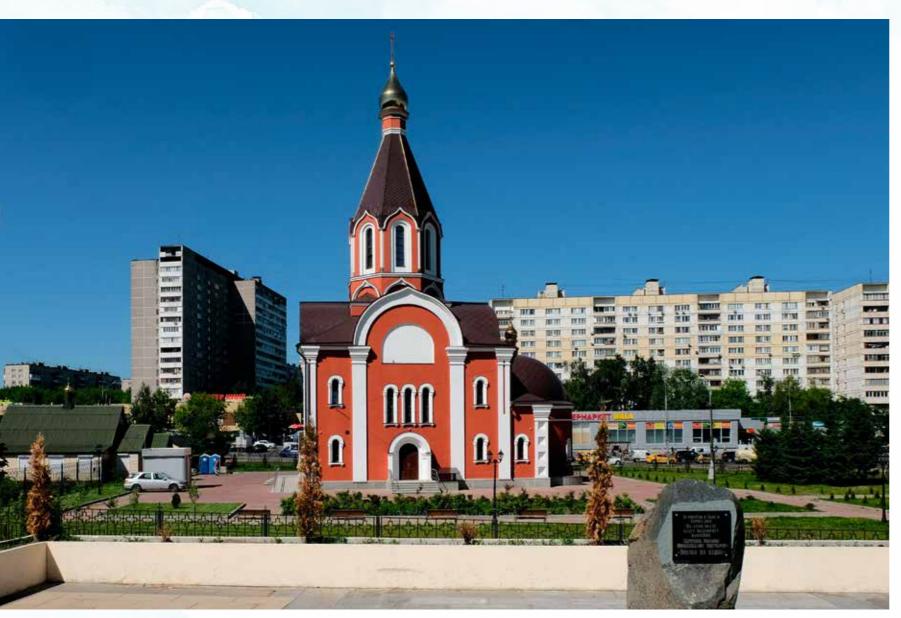


















Архитектор: А.Н. Оболенский Проектировщик: «Моспроект-2»

Вместимость: 300 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	0,5 га
2	Площадь застройки	442 m^2
3	Общая площадь здания, в том числе	760 м ²
4	- подземная часть	263
5	- надземная часть	497
6	Строительный объем храма, в том числе	5244 m ³
7	- подземная часть	969 m ³
8	- надземная часть	4275 m ³
9	Максимальная отметка верха здания	40,23 м
10	Этажность	1+антресоль+подклет
11	Площадь благоустройства, мощение плиткой	1906 м²
12	Площадь озеленения	2652 m ²


Наименование храма	Храм святой мученицы Татианы Римской в Люблине
Настоятель	иерей Виталий Данилюк
Дата назначения настоятеля	29 января 2015 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2+1 диакон
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	109559, г. Москва, ул. Краснодарская, вл. 50
Округ	ЮВАО
Район	Люблино
Численность населения района (приблизительно)	180 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	4
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,2 км
- с востока	1 KM
- с юга	0,8 км (в другом районе)
- с запада	3 км (в другом районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	100-180 чел.
Площадь участка:	0,51 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход):	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм муч. Татианы Римской в Люблине, вместимость: 100 чел.
Год начала строительства основного храма	2011 г.
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено № 77-152000-011516-2015, срок действия с 28.08.2015 по 28.11.2017
Вместимость строящегося храма, всего:	300 чел.
- верхнего храма	300 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм построен, разрабатывается проект для строительства приходского дома
Выполненные работы	
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	Строительство дома причта
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	Введен в эксплуатацию 29 сентября 2017 г.
Срок подготовки к Великому освящению	9 декабря 2018 г. чин великого освящения совершил Святейший Патриарх Кирилл


Сведения о проекте и инженерных сетя	IX			
Архитектор (ФИО):	Оболенский А.Н.			
Разработчик АГР:	ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина ИНН 7710966553, Свидетельство №П-4-15-1090 от 13 апреля 2015 г., СРО №095.01-2012-7710966553-И-003 от 19.08.2016.			
Год разработки АГР:	2010 г.			
Проектировщик:	ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина ИНН 7710966553, Свидетельство №П-4-15-1090 от 13 апреля 2015 г., СРО №095.01-2012-7710966553-И-003 от 19.08.2016.			
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ъеме		
Экспертная организация	Не требовалось			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения)	Не требовалось			7
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено


Генеральный подрядчик: ПК «Флогистон» (СРО-С-155-25122009) Технический заказчик: ГУП «УРиРУО»


Храм святого благоверного князя Андрея Боголюбского

(освящен 15.12.2019)

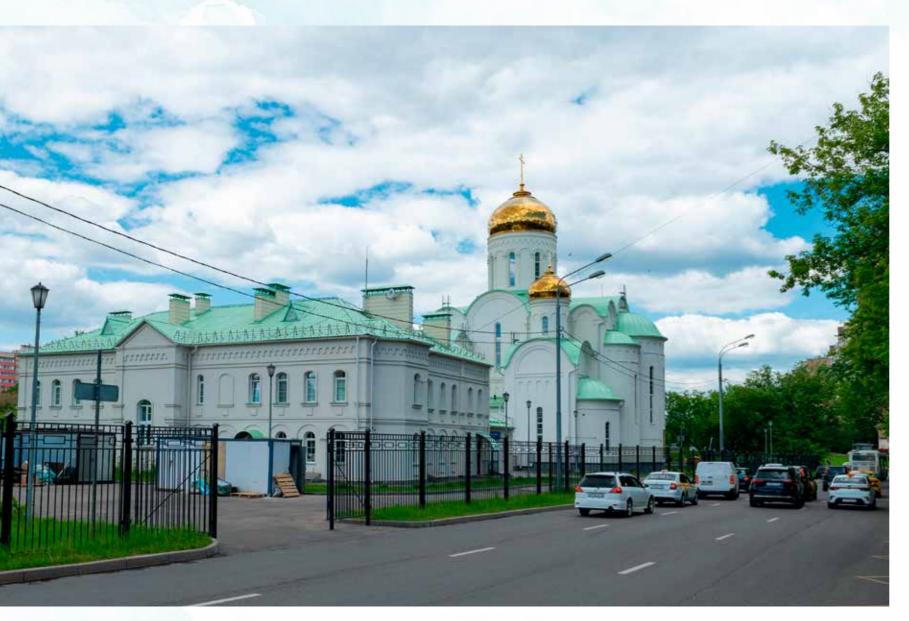


















Архитекторы: А.Н. Трофимов, Г.Г. Скугарева Проектировщики: ОАО «Моспроект-3

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	6456 м ²
2	Площадь застройки участка	1286: храм — 782, дом - 504 м ²
3	Общая площадь	1659: храм — 680, дом - 979 м ²
4	- подземная часть	$361,8$: храм — $22,8$, дом — 339 м^2
5	- надземная часть	1297,2: храм - 657,2, дом — 640 м ²
6	Строительный объем здания	13 950: храм $-$ 9000, дом $-$ 4950 м ³
7	- подземная часть	1474,9: храм — 64,9, дом — 1410 м ³
8	- надземная часть	12 475,1: храм — 8935,1, дом - 3540 м ³
9	Высота	Храм (до яблока) $-32,61,$ дом (до конька кровли) $-11,8$ м
10	Этажность	Храм: 1+техподполье+ антресоль (хоры), дом: 2+подвал

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программ	re 200
Наименование храма	Храм святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском
Настоятель	иерей Кирилл Краев
Дата назначения настоятеля	24.02.2014
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, Волгоградский пр-т, 85
Округ	ЮВАО
Район	Текстильщики
Численность населения района (приблизительно)	100 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	2
Удаленность от ближайших храмов, км:	2
- с севера	2 км
- с востока	3 км (в другом районе)
- с юга	2,5 км (в другом районе через трассу)
- с запада	6 км (в другом районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	120 чел.
Площадь участка	0,6 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Храм построен в 2019 г.
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского размещался на участке с 2014 по 2021 гг., вместимость: 75 чел.
Год начала строительства основного храма	2017 r.
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено № 77-204000-013856-2017 от 09.01.2017, срок действия: с 09.01.2017 по 09.01.2018
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности	Храм и дом причта построены
Выполненные работы	Выполнены проектные работы, оба здания возведены, сети подведены
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	июнь 2019 г.
Срок подготовки к Великому освящению	15 декабря 2019 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения
Примечания	


Сведения о проекте и инженерных се	гях				
Архитектор (ФИО):	Трофимов А.Н, Скугаре	Трофимов А.Н, Скугарева Г.Г.			
Разработчик АГР:	ОАО «Владимирреставрация», ОАО «Моспроект-3» (форма звонницы и куполов была изменена «Моспроект-3»)				
Год разработки АГР:	2017 г.				
Проектировщик:	ОАО «Моспроект-3» ИН	IH 7707020188 и CPO №0	767-2011-7707020188-П-3		
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ьеме			
Экспертная организация:	Мосгосэкспертиза				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	77-2-1-3-2697-18 11 сентября 2018 г.				
Рабочая документация:	Выполнена полностью				
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)	
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключены	
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключены	
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключены	
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключены	
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключены	
	Газоснабжение:	Не требуется	Не требуется	Не требуется	
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключены	


Генеральный подрядчик: ООО «ФПК Сатори» (ИНН 7726053171, ОГРН 1037739117261) Технический заказчик: Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии»


Храм святителя Димитрия, митрополита Ростовского


(освящен 20.12.2020)



















Архитектор: Г.Г. Скугарева

Проектировщик: «Моспроект-3»

Вместимость: 200 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
-1	Площадь земельного участка	0,28 га
2	Площадь застройки участка	559,3: храм — 252,2, дом — 307,1 м ²
3	Общая площадь	845: храм -383 , дом -462 м ²
4	- подземная часть	410: храм $-$ 179, дом $-$ 231 м 2
5	- надземная часть	435: храм - 204, дом — 231 м ²
6	Строительный объем здания	5179,3: храм — 2900 , дом — $2279,3$ м ³
7	- подземная часть	1548,4: храм -660 , дом $-888,4$ м ³
8	- надземная часть	3630,9: храм — 2240 , дом — $1390,9$ м ³
9	Этажность	Храм: 1+антресоль+подвал, дом: 1+подвал

Наименование храма	Храм святителя Димитрия Ростовского на Рязанке
Настоятель	иерей Димитрий Бобков
	2015 г.
Дата назначения настоятеля ———————————————————————————————————	2015 I.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	- Annual Charles and Annual An
Викарий А	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, ул. Вострухина, вл. 9 ЮВАО
Округ	
Район	Рязанский
Численность населения района (приблизительно)	108 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	5
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	3 км (в другом районе через шоссе)
- с юга	3 KM
- с запада	5 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	30-40 чел.
Ллощадь участка:	0,28 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход):	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные на- строения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.)	
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Не установлен
Год начала строительства основного храма	2015 r.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС: № 77-185000-015648-2017 от 26.10.2017 по 06.05.2018; № 77-185000-017850-2018 от 16.10.2018 по 30.04.2019
Days amounts and amount and a remain a remain and a remain a remain and a remain and a remain a	200 year
Вместимость строящегося храма, всего:	200 чел. 200 чел.
верхнего храманижнего храма	
Гекущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм и приходской дом построены и введены в эксплуатацию
Выполненные работы	Выполнена проектная и рабочая документация, устройство стен и кровельные работы, на храме установлен купол с крестом, проложены сети
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	2019 г.
Срок подготовки к Великому освящению	20 декабря 2020 г.
Примечания	


Сведения о проекте и инженерных сетя:	ĸ				
Архитектор (ФИО):	Скугарева Г.Г.				
Разработчик АГР:	ОАО «Моспроект-3» (И	HH 7707020188 и CPO №	9767-2011-7707020188-П-3	3)	
Год разработки АГР:	2015г.				
Проектировщик:	ОАО «Моспроект-3» (И	HH 7707020188 и CPO №	9767-2011-7707020188-П-3	3)	
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ьеме			
Экспертная организация:	Не требовалось				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	Не требовалось				
Рабочая документация:	Выполнена полностью				
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы Получение тех. условий Оплата тех.условий Подключение выпол но (да/нет)				
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Водосток:	Не получены	Не получены	-	
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	-	
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Получены	Подключено	


Генеральный подрядчик и технический заказчик: ООО «Риотекс»


Храм Покрова Пресвятой Богородицы


(освящен 10.04.2022)























Архитектор: Г.Г. Скугарева Проектировщик: «Моспроект»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	1,48 га
2	Площадь застройки участка	1364: храм — 800, дом - 564 м ²
3	Общая площадь	2332: храм — 1083, дом - 1249 м ²
4	- подземная часть	897 : храм — 480 , дом — 417 м^2
5	- надземная часть	1435: храм - 603 , дом -832 м ²
6	Строительный объем здания	17 194: храм — 12 640, дом — 4554 м ³
7	- подземная часть	3021: храм — 1626, дом — 1395 м ³
8	- надземная часть	14 173: храм — 11 014, дом - 3159 м ³
9	Этажность	Храм: 2+подземный, дом: 2+подземный

Наименование храма	Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях
Настоятель	иерей Александр Косых
Дата назначения настоятеля	29.09.2020 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	111674, г. Москва, ул. Покровская, д. 24
Округ	ЮВАО
Район	Некрасовка
Численность населения района (приблизительно)	108 388 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	1
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	8 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	8 км (в другом районе через шоссе)
- с юга	4 км (в другом районе через шоссе)
- с запада	4 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	120 чел.
Площадь участка	1,8141 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Подворье
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм не установлен
Год начала строительства основного храма	2015 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС № 77-166000-018721-2020 получено, срок действия с 10.02.2020 г. до 06.04.2021 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм и дом причта построены и введены в эксплуатацию
Выполненные работы	Выполнена проектная и рабочая документация, устройство стен и кривельные работы, на храме установлен купол с крестом, проложены се
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	03.08.2020 г.
Срок подготовки к Великому освящению	Освящен 10 апреля 2022 г.
Примечания	С 2020 г. богослужения в строящемся храме не прекращались


Сведения о проекте и инженерных сет	ях					
Архитектор (ФИО):	Скугарева Г.Г.	Скугарева Г.Г.				
Разработчик АГР:	«Моспроект» 7710091781					
Год разработки АГР:	2018 год					
Проектировщик:	«Моспроект» 7710091781					
Проектная документация:	Выполнена в полном обт	Беме				
Экспертная организация	ГАУ г. Москвы «Мосгосэ	кспертиза»; ООО «Мосэ	ксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения)		№ 77-1-1-3-0234-16 от 04.02.2016 г. № 77-2-1-3-008290-2020 от 20.03.2020 г.				
Рабочая документация:	Выполнена полностью					
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Тип сети / Этапы Получение тех. условий Оплата тех.условий подключение выполнено (да/нет)				
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено		
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено		
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено		
	Канализация:	Канализация: Получены Оплачены Подключено				
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено		
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось		
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено		


Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)			
Наименование организации:	ООО «ЮНИСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7704829100, ОГРН 1137746173685)		
Меняется ли на текущем этапе	нет		
Если меняется, кто был предыдущим	-		
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	В реестре с 1 августа 2016 г.		
Уставный капитал:	10 000 руб.		
Численность сотрудников:	21		
Чистая прибыль в 2021 г.:	623 тыс. руб.		
Участие в СРО:	-		
Основные виды деятельности компании:	Строительство жилых и нежилых зданий		


Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»


Храм Сретения Господня


(освящен 12.03.2023)

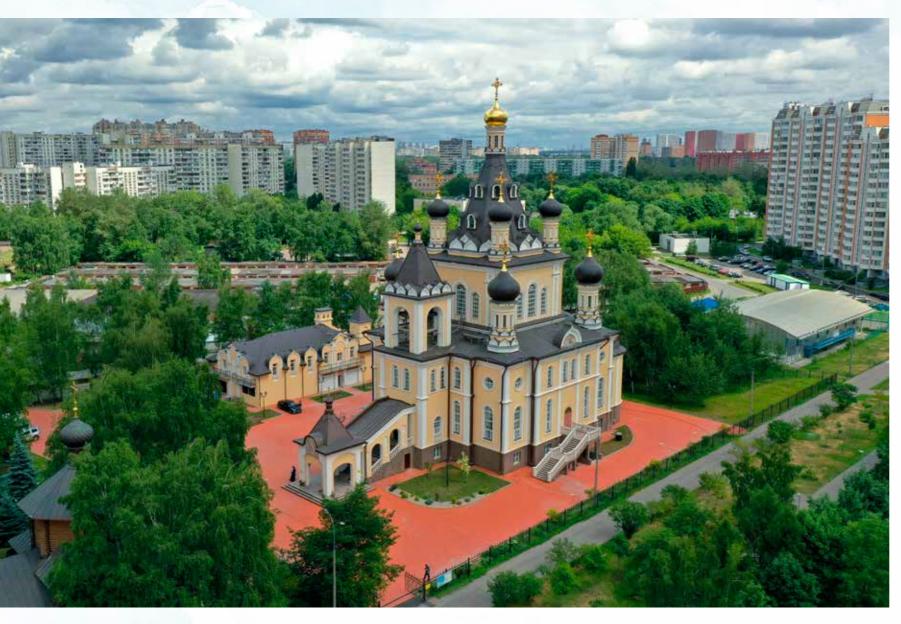


















Архитектор: К.А. Курбанлиев Проектировщик: ООО «Эра проект»

Вместимость: 1000 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,716 га
2	Площадь застройки участка, в том числе	1364,5 м ²
3	- храм	$1013,4 \text{ m}^2$
4	- здание хозяйственного назначения	351,1 м ²
5	Общая площадь	3147,4: храм — 2210 , дом — $937,4$ м ²
6	- подземная часть	1123: храм $-668,4$, дом $-454,6$ м ²
7	- надземная часть	2024,4: храм — 1541,6, дом — 482,8 м ²
8	Суммарная поэтажная площадь	2236,6: храм - 1605,6, дом — 631 м ²
9	Строительный объем	$23\ 117,55$: храм — $18\ 433,8$, дом — $4683,75\ \text{м}^3$
10	- подземная часть	7778,6: храм $-$ 5687,4, дом $-$ 2091,2 м ³
11	- надземная часть	15 338,95: храм — 12 746,4, дом — 2592,55 м ³
12	Высота	Xрам: 42,198, дом $-$ 8,3 м
13	Этажность	Храм: 2+подземная, дом: 2+подземная
14	Количество машиномест	11

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программ	re 200
Наименование храма	Храм Сретения Господня в Жулебине
Настоятель	иерей Марк Кравченко
Дата назначения настоятеля	12.11.2020
Число священников в храме (кроме настоятеля)	5
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, Саранская ул., вл. 1
Округ	ЮВАО
Район	мкр-н Жулебино (входит в состав района Выхино-Жулебино)
Численность населения района (приблизительно)	100 тыс.чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	В Жулебино - 2, Выхино - 1
Удаленность от ближайших храмов, км:	D Mysconno - 2, Dbianno - 1
<u> </u>	1 vy (n zpyrov počovo vopco wocco)
- с севера	1 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	1 км (в другом районе)
- с юга	5 км (в другом районе через шоссе)
- с запада	3 км (через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	250 - 400 чел.
Площадь участка	0,876 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Есть действующий с 1999 г. деревянный храм в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского на 200 чел.
Год начала строительства основного храма	2010 г.
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено: № 77-122000-012455-2016 от 04.04.2016 по 04.10.2018; № 77-122000-019366-2021 от 28.01.2021 по 30.04.2021
Вместимость храма:	1000 чел.
- верхнего храма	1000 чел.
- нижнего храма	50 чел
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Здание храма введено в эксплуатацию 29.04.2021
Выполненные работы	29 апреля 2021 г. храмовый комплекс в честь Сретения Господня был введен в эксплуатацию. Храм создан в классическом стиле по проекту, разработанному проектной организацией «Эра Проект», за основу взята идея московского архитектора Андрея Пенчковского. Высота храма 49 м, общая площадь – 2300 кв.м. Фасады украшены декоративными элементами и мозаичными иконами Сретения Господня, архангелов Михаила и Рафаила. Храм двухэтажный с техническим этажом. На первом этаже расположен крестильный храм, приходские помещения и конференц-зал площадью 200 кв.м. На втором этаже располагается основной храм, который рассчитан на размещение 1000 прихожан. Пол отделан известняком и различными видами мрамора, цоколь стен — челябинским мрамором. Иконостас и киоты чтимых икон — мрамор и палестинский известняк. Храм оборудован лифтом для подъема маломобильных прихожан, который был подарен В. И. Ресиным


Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	29.04.2021
Срок подготовки к Великому освящению	12 марта 2023 г. храм освящен Великим чином Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Примечания	С 1999 г. идут ежедневные богослужения в храме св.прав. Иоанна Кронштадтского, с 2019 г. – в храме Сретения Господня


Сведения о проекте и инженерных сетях					
Архитектор (ФИО):	Курбанлиев К.А.	Курбанлиев К.А.			
Разработчик АГР:	ООО «Эра Проект» (772	2413218)			
Год разработки АГР:	2014 г.				
Проектировщик:	ООО «Эра Проект» (772	2413218)			
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ьеме			
Экспертная организация	ООО «Мосэксперт»				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения)	№ 1166-MЭ/14 от 18.03.2015 г.				
Рабочая документация:	Выполнена полностью				
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы Получение тех. условий Оплата тех.условий нено (да/нет)				
	Электроснабжение:	Получены	Оплачено	Подключено	
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачено	Подключено	
	Водоснабжение:	Получены	Оплачено	Подключено	
	Канализация: Получены Оплачено Подключено				
	Водосток:	Получены	Оплачено	Подключено	
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось	
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачено	Подключено	


Генеральный подрядчик и технический заказчик: ООО «Монтажник» (ИНН 5001092807, ОГРН 1135001001310)


Храм апостола Андрея Первозванного


(строится)

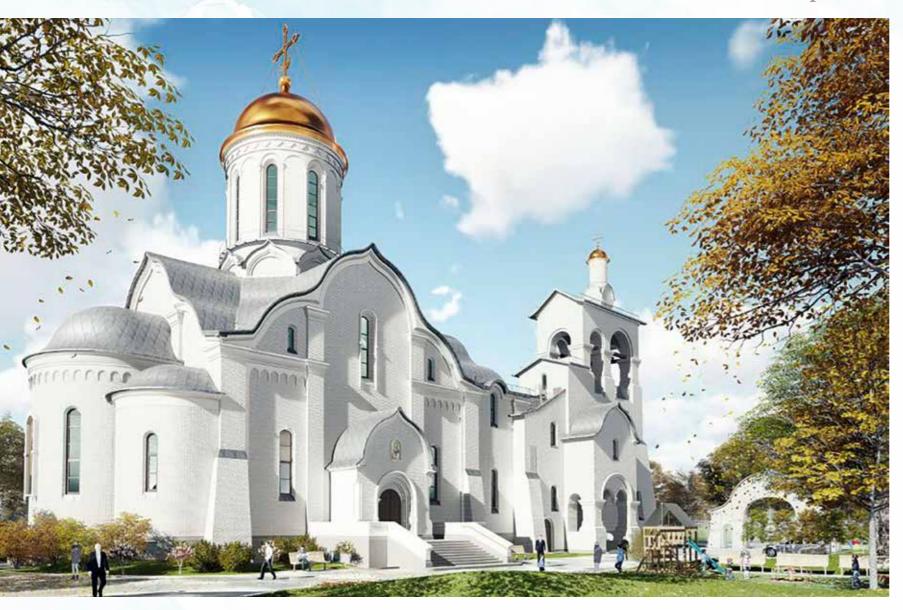


















Архитектор: А.С. Миненков

Проектировщик: ООО «Арх Проект-2»

Вместимость: 790 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина		
1	Площадь земельного участка/под новое строительство	1,4011/0,8205 га		
2	Площадь застройки участка, в том числе	1691 м²		
3	- храм с пристроенной звонницей	1515 м ²		
4	- здание санузлов для прихожан и ограда	84 и 92 м ²		
5	Общая площадь храма с пристроенной звонницей, в том числе	2627,2 м ²		
6	- подземная часть	1081,1 м²		
7	- надземная часть	1083,8 м²		
8	- открытые (неотапливамые) планировоч- ные элементы здания	462,3 м ²		
9	Общая площадь здания санузлов для при- хожан	99,6: 1 эт. – 46,5, подзем. – 53,1 м ²		
10	Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен	1309: храм — 1236, здание — 73 м ²		
11	Строительный объем храма с пристроенной звонницей, в том числе	22 110 м ³		
12	- подземная часть	5500 м ³		
13	- надземная часть	16 610 м ³		
14	Строительный объем здания санузлов	500: 1 эт. — 335, подзем. — 165 м ³		
15	Высота храма	38,45 м		
16	Этажность	Храм: 4 (в т.ч. подвал), здание санузлов: 2 (в т.ч. подвал)		
17	Количество машиномест	3		

	У Д П
Наименование храма	Храм святого апостола Андрея Первозванного в Люблине
Настоятель	протоиерей Виктор Шкабурин
Дата назначения настоятеля	02.04.1999 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	1 священник и 1 диакон
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	109559, г. Москва, ул. Ставропольская, вл. 25
Окрут	Юго-Восточный
Район	Люблино
Численность населения района (приблизительно)	173 200 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	4 общедоступных храма и 6 домовых
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,2 км (в другом районе)
- с востока	1 KM
- с юга	0,8 км
- с запада	4 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	150 чел.
Площадь участка	1,4011 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход храма св.ап. Андрея Первозванного (Договор безвозмездного пользования земельным участком №М-04-688884 от 25.02.2016 г.)
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные на- строения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, вместимость 150 чел.
Год начала строительства основного храма	2018 r.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	PC получено, срок действия с 19.09.2018 г. до 13.10.2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	790 чел.
- верхнего храма	790 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Нулевой цикл готов на 100%, общестроительные работы 50%, отделочные работы 0%
Выполненные работы	- Оформлена проектная и частично рабочая документация; - Построена цокольная часть здания; - Сооружены внешние инженерные сети; - Ведутся общестроительные работы надземной части храма (до отметки +13,100 м – звонница); - Залиты монолитные лестницы; - Изготовлены большой и малый купола; - Изготовлен колокол
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Монтаж и подключение внутренних инженерных сетей; - Возведение (полностью) стен, крыши, звонницы и установка куполов; - Отделочные работы по храму; - Благоустройство территории
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	
Срок ввода в эксплуатацию	Декабрь 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению	Не определен
Примечания	С 1999 г. богослужения в малом храме не прекращались

Архитектор (ФИО):	Миненков А.С.					
Разработчик АГР:	ООО «Арх Проект-2» (7704660912)					
Год разработки АГР:	2017 г.	1 1				
Проектировщик:	ООО «Арх Проект-2» (7	704660912)				
Проектная документация:	Выполнена полностью					
Экспертная организация:	«МОСКОВСКАЯ НЕГО «Мосэксперт»)	СУДАРСТВЕННАЯ ЭКСІ	ІЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬН	НЫХ ПРОЕКТОВ» (ООС		
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-0020-18 от 14	марта 2018 г.				
Рабочая документация:	Рабочая документация в	Рабочая документация выполнена на 90%				
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выпол- нено		
	Электроснабжение:	Получены		Подключено		
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены 116 289 руб.	Не подключено		
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены 3124,97 руб.	Не подключено		
	Канализация:	Получены	Оплачены 7142,86 руб.	Не подключено		
	Водосток:	Получены	Не оплачены	Не подключено		
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требуется	Не требуется		
	ГО ЧС и ПБ:	Пока не получены	Не оплачены	Не подключено		


Наименование организации:	ООО «ВМСТРОЙ» (ИНН 773019773 ОГРН 1167746202194)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	25.02.2016
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	24
Чистая прибыль в 2021 г.:	19 539 000 руб.
Участие в СРО:	ЭнергоСтройАльянс СРО-С-89-2711200
Основные виды деятельности компании:	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99)
Число судебных дел за последние 3 года:	4
Примечания:	2 ответчик, 2 истец


Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «Климат» (ИНН 7706538298, ОГРН 1047796406118)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	08.06.2004
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	4
Прибыль в 2021 г.:	142 000 руб.
Участие в СРО:	Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой» №3929 от 29.10.2021
Основные виды деятельности компании:	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
Число судебных дел за последние 3 года:	1
Примечания:	

пересечение улицы Поречная с Перервинским бульваром


Храм благоверных князей Петра и Февронии


(строится)

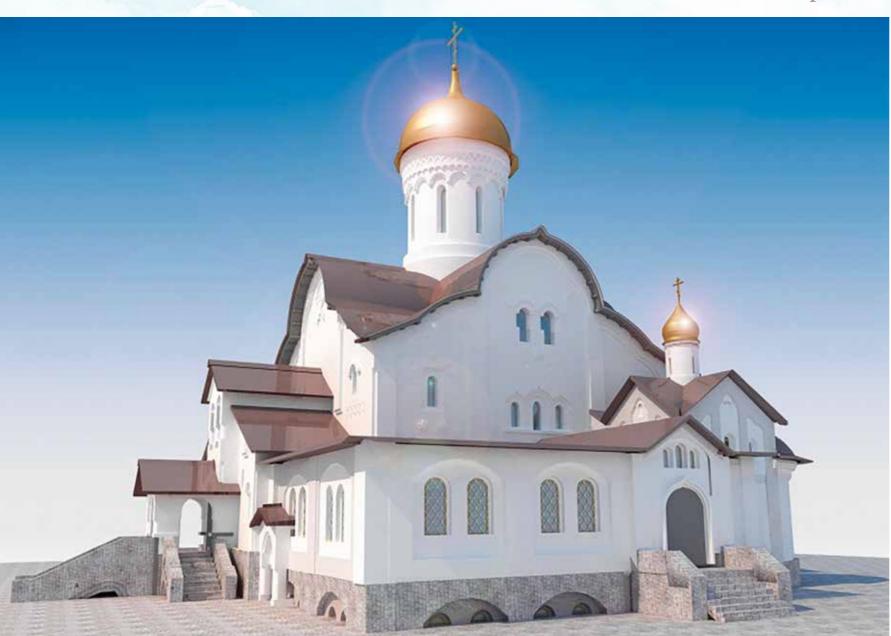







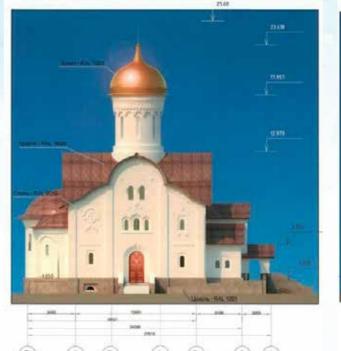

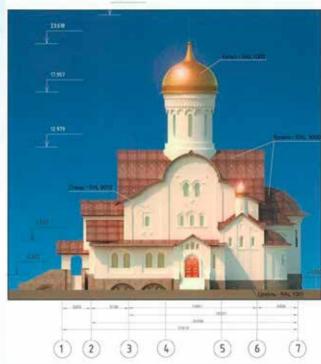







Архитектор: В.Б. Королев

Проектировщик: ООО «СТИЛЬ-А»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	4500 m^2
2	Площадь застройки	$568,2 \text{ m}^2$
3	Общая площадь храма	$590,3 \text{ m}^2$
4	- подземная часть	$184,6 \text{ m}^2$
5	- 1-й этаж, на отметке 0.000	$379,1 \text{ m}^2$
6	- 2-й этаж, на отметке 5,155	$26,6 \text{ M}^2$
7	Верхняя (относительная) отметка	26,73 м
8	Этажность	2+цокольный
9	Количество машиномест	20


Наименование храма	Храм святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьине
Настоятель	протоиерей Павел Гумеров
Дата назначения настоятеля	14.12.2012r.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	1
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, пересечение Перервинского бульвара и Поречной улицы
Округ	Юго-Восточный
Район	Марьино
Численность населения района (приблизительно)	267 668 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	6
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	2 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	4 км
- с юга	3 км (в другом районе через трассу)
- с запада	2 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	60 чел.
Площадь участка	0,4387 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Между ФХУ и городом Москвой заключен договор безвозмездного срочного пользования
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Близкие грунтовые воды
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь благоверных князей Петра и Февронии в Марьине, вместимость: 200 чел.
Год начала строительства основного храма	2021 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, срок действия с 2021 г. до 2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Отделочные работы по храмовому комплексу (готовность 45%)
Выполненные работы	- Оформлена проектная и частично рабочая документация, - Построен храм, установлены купола
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных сетей; - Отделочные работы по храму; - Строительство дома причта; - Благоустройство территории
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	апрель 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению	сентябрь 2024 г.
Примечания	Богослужения в строящемся храме не ведутся

Сведения о проекте и инженерных сет	ях				
Архитектор (ФИО):	Королев В.Б.				
Разработчик АГР:	ООО «Стиль-А» (7736640725)				
Год разработки АГР:	2017 r.				
Проектировщик:	ООО «Стиль-А» (7736640725)				
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме на здание храма, на здание дома причта проектная документация отсутствует				
Экспертная организация:	ООО «АкадемЭкспертиз	за»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-155000-019712-2021 or 19.08.2021r.				
Рабочая документация:	Выполнена полностью, кроме благоустройства территории				
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено	
	Электроснабжение:	Получены на безвозмездной основе	За счет средств АО МОЭСК	Подключено	
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачено 550 руб. за счет прихода	Не подключено	
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Получены	Оплачено 6,195 тыс. руб. за счет средств прихода	Не подключено	
	Канализация:	Получены	Оплачено 1,699 тыс. руб. за счет средств прихода	Не подключено	
	Водосток:	Не получены	Не оплачены	Сброс на рельеф	
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требуется	Не требуется	
	ГО ЧС и ПБ:	Не получены	Не оплачено	Не подключено	

Генеральный подрядчик и технический заказчик: Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

Храм Воскресения Словущего


(строится)

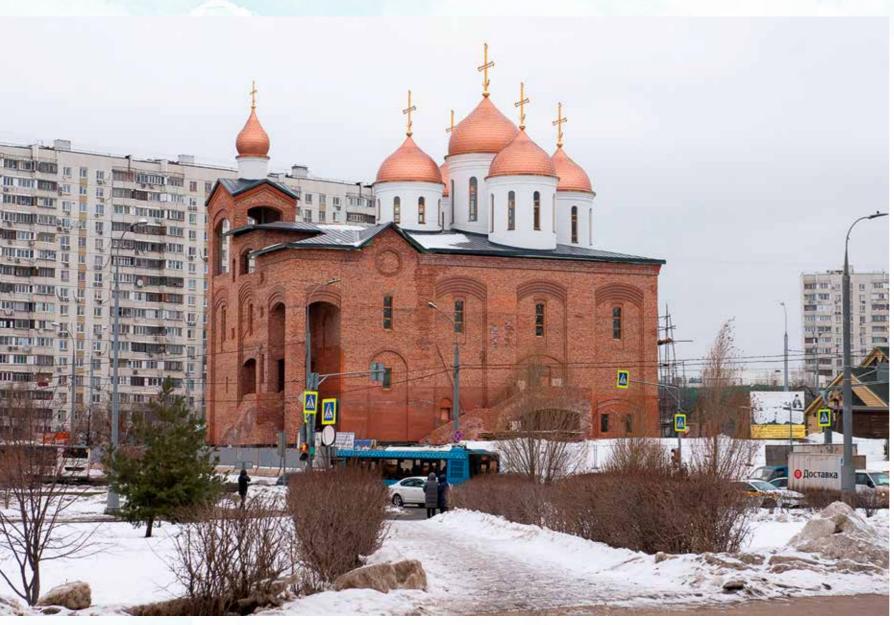


















Архитектор: П.О. Гридасов Проектировщик: ООО «ССК-ПРОЕКТ»

Вместимость: 1000 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,73 га
2	Площадь застройки храма	850 m^2
3	Суммарная поэтажная площадь храма в габаритах наружных стен	1850
4	Общая площадь храма	1570 m^2
5	- надземная часть	1570 m^2
6	- полезная надземная площадь	1400
7	Верхняя (относительная) отметка	31,71 м
8	Этажность	4
9	Количество машиномест	32

Наименование храма	храм Воскресения Словущего в Марьинском парке
наименование храма Настоятель	протоиерей Сергий Волков
Пастоятель Цата назначения настоятеля	26.11.2004 г.
	2.11.20041.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	архиепископ Егорьевский Матфей
Викарий	г. Москва, Марьинский парк, пересечение ул. Белореченской и Перервь
Адрес храма	
Округ	ЮВАО
Район	Марьино
Численность населения района (приблизительно)	271 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	7
Удаленность от ближайших храмов, км:	1,2 км (в другом районе)
- с севера	1,7 км (в другом районе)
- с востока	0,7 км
- с юга	1,4 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	20-80 чел.
Площадь участка:	Два участка общей площадью 0,73 га
Собственник участка (ФХУ / Приход):	
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные на- строения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь свт. Луки, архиеп. Симферопольского, вместимость: 200 чел.
Год начала строительства основного храма	2018 r.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	PC получено, срок действия с 26.10.2018 г. до 25.12.2022 г, продлено до конца 2023 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	1000 чел.
- верхнего храма	800 чел.
- нижнего храма	200 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Отделочные работы по храму (готовность 95%)
Выполненные работы	 Оформлена проектная и частично рабочая документация; Построен храм, установлены купола; Построена цокольная часть здания вспомогательного назначения храмового комплекса (дома причта); Подведено электричество, канализация; Оплачен проект прокладки теплосети; Выполняются работы по водоснабжению храма
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Завершение отделочных работ по храму; - Строительство дома причта
Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	01.12. 2023 г.
Срок подготовки к Великому освящению	II квартал 2024 г.
Примечания	С 2013 г. богослужения во временном храме не прекращались

Сведения о проекте и инженерных сет	ях					
Архитектор (ФИО):	Гридасов П.О.					
Разработчик АГР:	ООО «Творческая мастерская архитектора О.Гридасова» (ИНН 7710313770, ОГРН 1037739135653)					
Год разработки АГР:	2021 (2023) г.	1	1 1 1			
Проектировщик:	ООО ССК-ПРО	ЭЕКТ (ИНН	Г 7717690230, ОГРН 51	107746053751)		
Проектная документация:	Выполнена в по			<u> </u>		
Экспертная организация:	ООО «Мосэкст	ерт»				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 2359 от 03.11.2021 г.					
Рабочая документация:	Выполнена пол	ностью				
	Тип сети / Этаг	ІЫ	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)	
	Электроснабже	ние:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Теплоснабжени	ie:	Не требовалось	Не требовалось	Не требуется	
Подключение к сетям:	Водоснабжение	:	Получены	Оплачены	Подключено	
	Канализация:		Получены	Оплачены	Подключено	
	Водосток:		Получены	Оплачены	Подключено	
	Газоснабжение:		Получены	Оплачены	Подключено	
	ГО ЧС и ПБ:		Получены	Оплачены	Подключено	
Сведения о подрядчике (по отчету СП.	APK)					
Наименование организации:		OOO «Mo	нтажник» (ИНН 5001	092807 ОГРН 11350010013	310)	
Меняется ли на текущем этапе		нет				
Если меняется, кто был предыдущим		не меняется				
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:		04.03.2013 г.				
Уставный капитал:		10 000 руб.				
Численность сотрудников:		4				
Чистая прибыль в 2021 г.:		2 400 000 py6.				
Участие в СРО:		Ассоциация «СРО Мособлстройкомплекс»				
Основные виды деятельности компании	:	Производство отделочных и прочих завершающих работ				
Число судебных дел за последние 3 года:		нет				
Примечания:		-				
Сведения о техническом заказчике (по	отчету СПАРК)					
Наименование организации:			ООО «ССК Проект» (ИНН 7717690230, ОГРН 5107746053751)			
Меняется ли на текущем этапе		Нет				
Если меняется, кто был предыдущим		Не меняется				
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	23.12.2010 г.					
Уставный капитал:		11 000 руб				
		17				

16

-37 451 руб.

Ассоциация «СРО ОПрО»

Деятельность в области архитектуры

Прибыль в 2021 г.:

Участие в СРО:

Примечания:

Численность сотрудников:


Основные виды деятельности компании:

Число судебных дел за последние 3 года:


Храм первоверховных апостолов Петра и Павла


(строится)




















Архитектор: А.И. Терехин

Проектировщик: ООО «АрхМасштаб»

Вместимость: 750 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,4 га
2	Площадь застройки храма	734,9 м ²
3	Суммарная поэтажная площадь храма в габаритах наружных стен	1850
4	Общая площадь храма	667,7 м ²
5	- надземная часть	667,7 м ²
6	Строительный объем	9085 m^3
7	Верхняя (относительная) отметка	30,4 м
8	Этажность	2


Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	Value was and an area of the second of the s
Наименование храма	Храм в честь апостолов Петра и Павла в Люблине
Настоятель	иерей Георгий Иванов
Дата назначения настоятеля	29.05.2013
Число священников в храме (кроме настоятеля)	0
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, Тихорецкий бульвар, вл. 1
Округ	ЮВАО
Район	Люблино
Численность населения района (приблизительно)	172 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с северо-запада	1,1 км (через сквер)
- с юго-запада	0,9 км (в сквере)
- с юго-запада	1,5 км (в соседнем районе)
- с юго-востока	1 км (в парке)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	150 чел.
Площадь участка	0,4 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ РПЦ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Не имеется
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Малый храм в честь преподобного Саввы Освященного в Любине (освящен великим чином в 2014 г.), вместимость: 150 чел
Год начала строительства основного храма	2019 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, срок действия с 15.06.2020 г. до 15.06.2023 г. (гот вятся материалы для продления)
Вместимость строящегося храма, всего:	750 чел.
- верхнего храма	750 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Выполнен монтаж стен, ведутся кровельные работы (выполнение 30 %)
Выполненные работы	 Оформлена проектная и рабочая документация; Построен храм (стены); Купола и кресты установлены, Ведутся кровельные работы; Подведены наружные коммуникации: электричество, канализация, водопровод
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата- цию храмового комплекса	- Завершение кровельных работ; - Отделочные работы по храму (внутренние и наружные); - Устройство внутренних инженерных сетей; - Благоустройство территории
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	декабрь 2023 г.
Срок подготовки к Великому освящению	июнь 2024 г.
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных со Архитектор (ФИО):	Терехин А.И.				
Разработчик АГР:	OOO «АрхМасштаб» (ИНН 7714385535)				
Год разработки АГР:	2019 r.				
Проектировщик:	ООО «АрхМасштаб» (ИНН 7714385535) Саморегулируемая организация: АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» СРО-П-179-12122012				
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме				
Экспертная организация:	Экспертиза про	екта не про	оводилась		
Рабочая документация:	Выполнена полі	ностью			
	Тип сети / Этап	њ	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено
	Электроснабже	ние:	Получены	Оплачены 98 тыс.руб.	Подключено
	Водоснабжение	:	Получены	Оплачены 449 руб.	Подключено
Подключение к сетям:	Канализация:		Получены	Оплачены 449 руб.	Подключено
	Теплоснабжени	e:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
	Водосток:		Не требуется	Не требуется	На рельеф
	Газоснабжение:		Не требуется	Не требуется	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:		Получены	0,76 млн руб. Не оплачены	Не подключено
Сведения о подрядчике (по отчету С	ПАРК)				
Наименование организации:		ООО «Монтажник» (ИНН 5001092807, ОГРН 1135001001310)			
Меняется ли на текущем этапе		нет			
Если меняется, кто был предыдущим		-			
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:		26.02.201	3		
Уставный капитал:		10 тыс. р	уб.		
Численность сотрудников:		4			
Чистая прибыль в 2022 г.:		8 292 000	руб.		
Участие в СРО:			СТРОИТЕЛИ МОСКО СРО на строительство	ОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МО о – до 500 млн руб.	СОБЛСТРОЙКОМ-
Основные виды деятельности компании:		Произво, жилых и	дство прочих отделочн нежилых зданий (41.2	ных и завершающих работ 20)	г (43.39), Строительство
Сведения о техническом заказчике (п	по отчету СПАРК)				
Наименование организации:		Религиозная организация «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Свиблово г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»(ИНН 7716043671, ОГРН 1027739892025) СРО-С-113-15122009, СРО-П-211-23072019			
Меняется ли на текущем этапе		нет			
Если меняется, кто был предыдущим		-			
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:		24.02.1995			
Уставный капитал:		-			
Численность сотрудников:		-			
Прибыль в 2022 г.:		-			
Участие в СРО:		Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединенные строители», СРО на строительство – до 60 млн руб.			
Основные виды деятельности компан	ии:	Деятельность религиозных организаций (94.91)			
Число судебных дел за последние 3 года:		_			
711 11 11 1	·				

Сведения о проекте и инженерных сетях

Храм мучеников Анатолия и Протолеона


(строится)

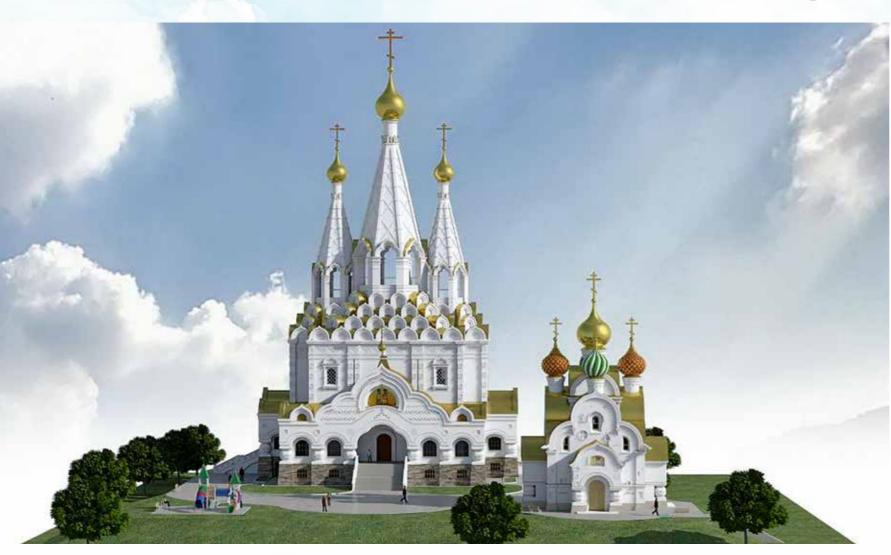











Архитектор: Ф.И. Афуксениди

Проектировщик: ООО «Бюро архитектурностроительного проектирования «АС про»

Вместимость: 800 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,6371 га
2	Площадь застройки храма	1048,49 (храм-часовня — 162) м ²
3	Общая площадь храма, в том числе	1694,7 (храм-часовня — 216,6) м ²
4	- надземная часть	1033,4 (храм-часовня — $125,1$) м ²
5	- подземная часть	661,3 (храм-часовня — 91,5) м ²
6	Строительный объем, в том числе	19 874,4 (храм-часовня—1997,5) м ³
7	- надземная часть	16 729 (храм-часовня — 1511,5) м ³
8	- подземная часть	3145,4 (храм-часовня — 486) м ³
9	Верхняя (относительная) отметка	30,4 м
10	Этажность	2+подвал+антерс. (храм-часовня:1+подвал+антрес.)

	te 200	
Наименование храма	Храм святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьине	
Настоятель	иерей Виталий Ульянов	
Дата назначения настоятеля	09.12.2012 г.	
Число священников в храме (кроме настоятеля)	1	
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей	
Адрес храма	109341, г. Москва, ул. Братиславская, парк имени Артема Боровика	
Округ	ЮВАО	
Район	Марьино	
Численность населения района (приблизительно)	252 623 чел.	
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	6	
Удаленность от ближайших храмов, км:		
- с севера	1 км (в этом же районе через бульвар)	
- с востока	1 км (в этом же районе через парк)	
- с юга	2 км (в этом же районе через бульвар)	
- с запада	2 км (в этом же районе через парк)	
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	60 чел.	
Площадь участка:	0,63 ra	
Собственник участка (ФХУ / Приход):	ФХУ	
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные на- строения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)		
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь свв. мчч. Анатолия и Протолеона, вмес мость: 120 чел.	
Год начала строительства основного храма	2019 г.	
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	PC получено, срок действия с 15.07.2019 г. до 15.05.2025 г.	
Вместимость строящегося храма, всего:	800 чел.	
- верхнего храма	800 чел.	
- нижнего храма	-	
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	60% готовности. Возведены стены под кровлю, выполняется перекры тие основной части храмового комплекса	
Выполненные работы	- Оформлена проектная и рабочая документация; - Выполнена стилобатная часть храма с перегородками и возведены стены основного храма под кровлю; - Подведено электричество по постоянной схеме; - Выполнено проектирование сетей	
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных сетей; - Возведение кровли храма с шатровой частью и куполами; - Устройство внутренней инженерии по храму; - Отделочные работы по храму; - Благоустройство территории	
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-	
Срок ввода в эксплуатацию	Декабрь 2025 г.	
Срок подготовки к Великому освящению	Май 2025 г. (К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечествен ной войне)	
Примечания	Храм посвящен памяти погибших воинов в годы Великой Отечественой войны и памяти погибших военных корреспондентов	


Архитектор (ФИО):	Афуксениди Ф.И.			
Разработчик АГР:	ООО «Бюро архитектурно-строительного проектирования «Ас про» (ИНН 2320139693)			
Год разработки АГР:	2015 г.			
Проектировщик:	ООО «Бюро архитектур	но-строительного проек	тирования «Ас про» (ИНН	H 2320139693)
Проектная документация:	Выполнена в полном обт	ьеме		
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-0001-16 or 15.01.2016 r.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены полно- стью 626 424,24 руб.	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены 10 048 204 млн руб.	Оплачены частично 7 033742.8 млн руб.	Не подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены полно- стью 10 092,12 тыс.руб.	Не подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены полно- стью 2 982 тыс.руб.	Не подключено
	Газоснабжение	Не требуется	Не требуется	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Не оплачены	Не подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены полно- стью 17 573,33 тыс.руб.	Не подключено


Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	ООО «СМ Инжиниринг» (ИНН 5032202200, ОГРН 1155032003642)
Наименование организации:	-
Меняется ли на текущем этапе	нет
Если меняется, кто был предыдущим	
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	07.04.2015, 8 лет
Уставный капитал:	10 000 руб. 2015г.
Численность сотрудников:	25чел.
Чистая прибыль в 2021 г.:	7 188 000 000
Участие в СРО:	АС «Национальный альянс строителей» СРО-С-246-1306201215.06.2017г
Основные виды деятельности компании:	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) (Снос зданий и сооружений, геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, подготовительные работы, земляные работы, устройство скважин, свайные работы, закрепление грунтов, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, усиление бетонных и железобетонных конструкций, буровзрывные работы при строительстве, работы по устройству каменных конструкций, монтаж металлических конструкций, монтаж деревянных конструкций, защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, устройство кровель, фасадные работы, светопрозрачные конструкции, огнезащита конструкций, устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (ОВ, ВК, ЭОМ, СС и АК), монтажные работы (лифты, оборудование), пусконаладочные работы, работы по осуществлению стро ительного контроля, экспертиза проектной документации
Число судебных дел за последние 3 года:	6
Примечания:	

Технический заказчик: Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии»


Храм праведного Симеона Верхотурского


(строится)

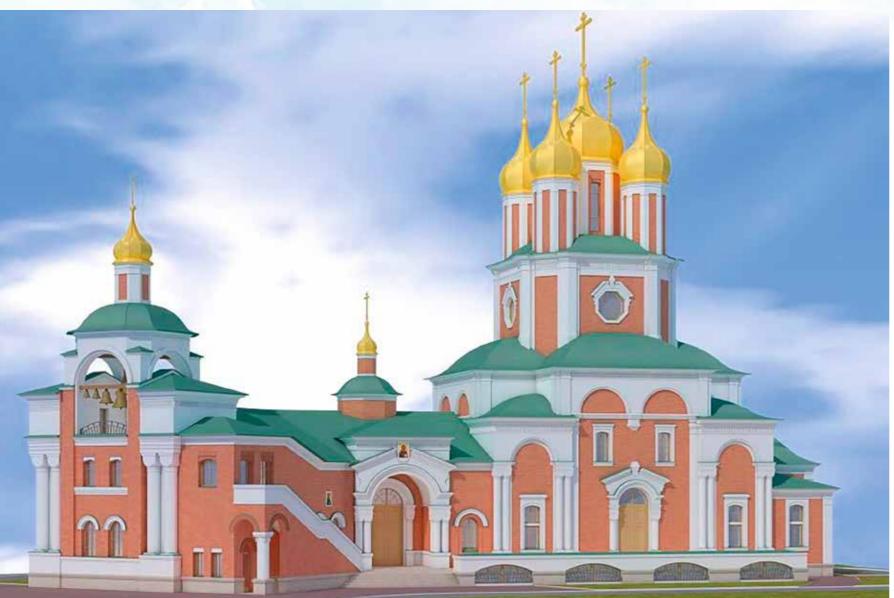


















Архитектор: С.В. Борисов

Проектировщик: ООО «Сапрыкин и Пузырева»

Вместимость: 600 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	3100 m^2
2	Площадь застройки храма	930 м ²
3	Общая площадь здания	$1537,78 \text{ m}^2$
4	Общая площадь храма, в том числе	$461,88 \text{ m}^2$
5	- подземная часть	197,43 m ²
6	- надземная часть	$264,45$ M^2
7	Общая площадь приходской части, в том числе	1075,9 м ²
8	- подземная часть	$415,2 \text{ M}^2$
9	- надземная часть	$660,7 \text{ m}^2$
10	Полезная площадь	$1293,88 \text{ m}^2$
11	Строительный объем, в том числе	9306 m^3
12	- подземная часть	2811 m ³
13	- надземная часть	6495 m^3
14	Высота здания до основания креста	30,2 м
15	Этажность	2+подземный
16	Количество парковочных мест	4

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святого праведного Симеона Верхотурского в Марьине
Настоятель	иерей Александр Герего
Дата назначения настоятеля	09.12.2012
Нисло священников в храме (кроме настоятеля)	1
	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, Новочеркасский бульвар, вл. 6-8
Округ	ЮВАО
Район	Марьино
Нисленность населения района (приблизительно)	271 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	6
удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	6 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	3 км
- с юга	7 км (в другом районе через Москва-реку)
- с запада	12 км (в другом районе через Москва-реку)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	80 чел.
Площадь участка	0.31 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь святых преподобных Кирилла и Марии Радонежских, вместимость: 150 чел.
Год начала строительства основного храма	2022 г.
Цействующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	PC получено, срок действия с 07.04.2023 г. до 07.04.2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	600 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	100 чел
Гекущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Выполнены работы по подземному этажу
Выполненные работы	- Оформлена проектная и частично рабочая документация; - Построен цокольный этаж храма и приходского дома; - Подведено электричество
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата- цию храмового комплекса	- Выполнить рабочие проекты по наружному отоплению, водопроводу, канализации, по внутренним инженерным системам, включая ЦТП; - Выполнить работы по надземной части храма и приходского дома: кирпичные стены, мон.ж.б. каркас, кровля, купола, кресты; - Проложить наружные сети отопления, водопровода и канализации; - Выполнить устройство внутренней инженерии, отделочные работы, включая фасад
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	Ориентировочный срок сдачи храма в эксплуатацию – 2025 г.
Срок ввода в эксплуатацию	декабрь 2025 г.
Срок подготовки к Великому освящению	Не определен
Примечания	С 2014 года богослужения совершаются во временном храме


Архитектор (ФИО):	Борисов С.В.			
Разработчик АГР:	ООО «Сапрыкин и Пузырева» (ИНН 7705831470)			
Год разработки АГР:	2018 г.			
Проектировщик:	ООО «Сапрыкин и Пузырева» (ИНН 7705831470), выписка СРО № ВЗ-165/2018 от 02.10.2018			
Проектная документация:	Выполнена полностью			
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-015894-2019 or 25.06.2019 r.			
Рабочая документация:	Выполнена рабочая документация «АР» и «КЖ»			
Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены 1 281 987,58 руб.	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены 3 014 178,32 руб.	Не подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены 13 535,87 руб.	Не подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены 7786,67 руб.	Не подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены 13 154,25 руб.	Не подключено
	Газоснабжение:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены 45 000 руб.	Не подключено


Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «ЮНИСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7704829100, ОГРН 1137746173685)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	28.02.2013
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	22
Чистая прибыль в 2022 г.:	1 975 тыс. руб.
Участие в СРО:	Регистрационный номер члена в реестре СРО № 211116/681 от 21.11.2016 выдано СРО «Архитектурное наследие»
Основные виды деятельности компании:	Строительство, проектирование
Число судебных дел за последние 3 года:	
Примечания:	-


Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»


Храм Преображения Господня

(проектируется)

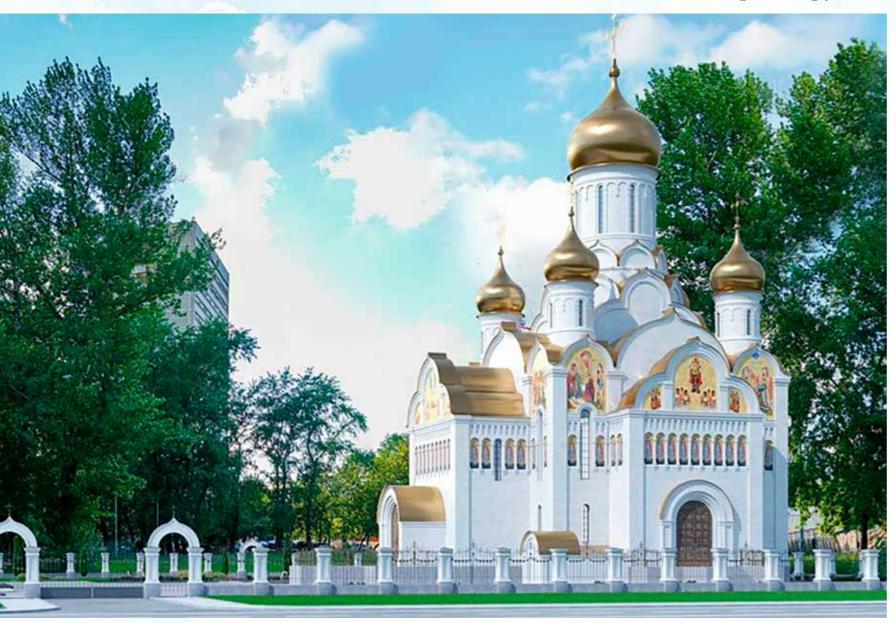














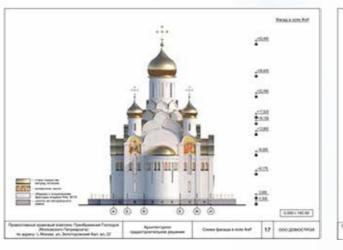



Архитектор: А.А. Мамонов

Проектировщик: ООО «Домострой»

Вместимость: 550 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	6692 m^2
2	Площадь застройки храма	599 m^2
3	Общая площадь храма, в том числе	$825,7 \text{ m}^2$
4	- подземная часть	$474,5 \text{ m}^2$
5	- надземная часть	$351,2 \text{ M}^2$
6	Количество этажей храма	2
7	- подземная часть	1
8	- надземная часть	1 + антресоль
9	Полезная площадь	$1293,88 \text{ m}^2$
10	Верхняя относительная (абсолютная) отметка	33,4 (173,9) м
11	Прендельная высота здания храма (до подкрестного яблока)	34,9 м
12	Суммарная поэтажная площадь храма (в габаритах наружных стен)	398,9 м ²
13	Количество машиномест	16

Наименование храма	Храм Преображения Господня в Лефортове
Настоятель	иерей Николай Рыжков
Гата назначения настоятеля	Указ № У-02/93 от 14.07.2020
Нисло священников в храме (кроме настоятеля)	1
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	111 033, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 22
Округ	Юго-Восточный
Район	Лефортово
Нисленность населения района (приблизительно)	106 078 чел. (2023 г.)
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	3 храма
удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	7,8 км (через ж/д в другом районе)
- с востока	1,91 км (через несколько улиц)
- с юга	700 м (в другом районе через ж/д)
	812 м (через несколько улиц)
- с запада Количество причастников в воскресные и праздничные дни	10-20 чел.
Ілощадь участка	0.6692 ra
Лощадь участка Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между килых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь святителя Николая Чудотворца, архи пископа Мирликийского, вместимость: 120 человек
од начала строительства основного храма	2023 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	
Вместимость строящегося храма, всего:	550 чел.
- верхнего храма	450 чел.
- нижнего храма	100 чел.
Гекущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Приступили к строительству нулевого цикла
Зыполненные работы	Выполнены все земляные работы (котлован), и залита подбетонка под плиту фундамента
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата- цию храмового комплекса	- Завершение нулевого цикла; - возведение храма выше нуля; - монтаж внутренних инженерных сетей и подключение внешних инженерных сетей; - выполнение работ по интерьерам и убранству храма; - благоустройство территории
Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	Дефицит финансирования
Срок ввода в эксплуатацию	Не определен
Срок подготовки к Великому освящению	Не утвержден
Тримечания	Во временном храме регулярно проводятся богослужения

Сведения о проекте и инженерных сет	ж				
Архитектор (ФИО):	ООО «ДОМОСТРОЙ»				
Разработчик АГР:	ООО «ДОМОСТРОЙ» І	ИНН 7708679671			
Год разработки АГР:	2023 г.				
Проектировщик:	ООО «ДОМОСТРОЙ» 7 10.04.2016г. в реестре СЕ	ООО «ДОМОСТРОЙ» 7708679671, СРО: регистрационный №П-166-007726512555-0830 от 10.04.2016г. в реестре СРО			
Проектная документация:	В работе				
Экспертная организация:	Пока не определена				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	-				
Рабочая документация:	В работе		-37.1		
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)	
	Электроснабжение:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	
	Теплоснабжение:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	
	Канализация:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	
	Водосток:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	
	Газоснабжение:	Не требуется	Не требуется	Не требуется	
	ГО ЧС и ПБ:	Не получили	Не оплачено	Не подключено	

Генеральный подрядчик: ООО «ПСК Стройтехнологии» (ИНН 5029271193) Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛатурСтрой» (ИНН 7719433180) пересечение Самаркандского бульвара и Ферганской улицы


Храм преподобного Паисия Святогорца


(проектируется)




















Архитекторы: С.В. Борисов, Г.Г. Скугарева Проектировщик: ООО «Юнистройпроект»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	4316 м ²
2	Площадь застройки	$1496,1 \text{ m}^2$
3	Общая площадь комплекса, в том числе	$2952,38 \text{ m}^2$
4	Общая площадь храма	$1454,82 \text{ m}^2$
5	- надземная часть	$723,42 \text{ m}^2$
6	- подземная часть	$731,4 \text{ m}^2$
7	Общая площадь приходской части	1497,56 м ²
8	- надземная часть	$1143,25 \text{ m}^2$
9	- подземная часть	354,31
10	Строительный объем комплекса	20 113 м ³
11	- подземная часть	5083 M^3
12	- надземная часть	$15\ 030\ \mathrm{M}^3$
13	Высота храма	$31,64 \text{ m}^3$
14	Высота приходской части	$12,66 \text{ m}^3$
15	Этажность комплекса	3 + подземный
16	Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен	2570 m^2

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программ	te 200
Наименование храма	Храм преподобного Паисия Святогорца в Выхине
Настоятель	иерей Евгений Толмачев
Дата назначения настоятеля	07.10.2019
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, пересечение ул. Ферганской и Самаркандского б-ра
Округ	Юго-Восточный
Район	Выхино-Жулебино
Численность населения района (приблизительно)	225 043 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	4 км
- с востока	4 км
- с юга	2 KM
- с запада	5 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	50 чел.
Площадь участка	0,4316 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	РО «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь вемельного участка и пр.)	Между причтовой частью и храмовой частью лежат кабели сетей связи
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм Покрова Пресвятой Богородицы, вместимость: 80 чел.
Год начала строительства основного храма	2023 г.
Цействующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	PC получено, срок действия с 31.07.2023 г. до 15.11.2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- крестильня на отм3.60	до 50 чел.
Гекущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Выполнены работы по «0» циклу храма и приходского дома
Выполненные работы	- Оформлена проектная и частично рабочая документация; - Построен цокольный этаж храма и приходского дома; - Подведено электричество
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Выполнить рабочие проекты по наружному отоплению, водопроводу, канализации, по внутренним инженерным системам, включая ЦТП; - Выполнить работы по надземной части храма и приходского дома: кирпичные стены, мон.ж.б. каркас, кровля, купола, кресты, наружные сети по отоплению, водопроводу и канализации, внутренняя инженерия отделочные работы, включая фасад
Грудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	Вопросы финансирования
Срок ввода в эксплуатацию	Ориентировочный срок сдачи храма в эксплуатацию – 2025 г.
Срок подготовки к Великому освящению	


Сведения о проекте и инженерных сетя	x			
Архитектор (ФИО):	Борисов С.В., Скугарева Г.Г.			
Разработчик АГР:	ООО «Юнистройпроект	» (ИНН 7704829100, ОГІ	PH 1137746173685)	
Год разработки АГР:	20.04.2023г.			
Проектировщик:	ООО «Юнистройпроект	» (ИНН 7704829100,и СІ	РО -П-168-22112011)	
Проектная документация:	Выполнена в полном обт	ьеме и получено положи	тельное заключение экспеј	ртизы
Экспертная организация:	ООО «СК «РЕСУРС»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-038535-2022 от 16.06.2022 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех. условий	Подключение выполнено
	Электроснабжение:	Получено	Оплачено	В работе
	Теплоснабжение:	Получено	Оплачено	Не подключено
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Получено	Оплачено	Не подключено
	Канализация:	Получено	Оплачено	Не подключено
	Водосток:	Не получено	Не оплачено	Не подключено
	Газоснабжение:	Не требуется	Не оплачено	Не подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Не получено	Не оплачено	Не подключено


Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «Юнистройпроект» (ИНН 7704829100, ОГРН 1137746173685)
Меняется ли на текущем этапе	нет
Если меняется, кто был предыдущим	-
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	28.02.2013
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	22 чел.
Чистая прибыль в 2021 г.:	1 975 000 руб.
Участие в СРО:	Регистрационный номер члена в реестре СРО № 211116/681 от 21.11.2016 выдано СРО «Архитектурное наследие»
Основные виды деятельности компании:	Строительство, проектирование
Число судебных дел за последние 3 года:	-
Примечания:	-


Технический заказчик: Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии»


Храм мученика Андрея Стратилата


(выполнена стадия «П», не строится)

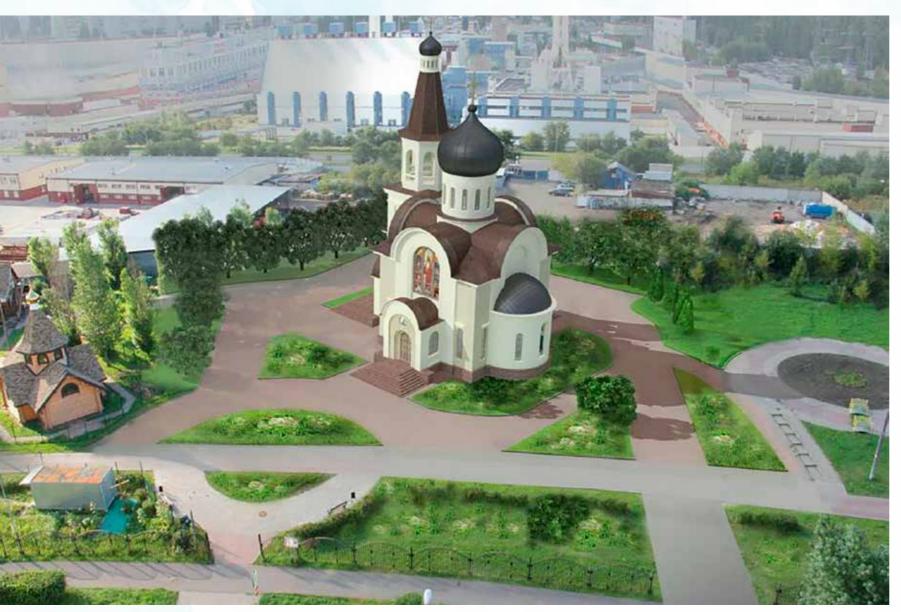












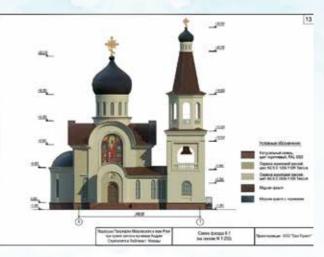





Архитектор: К.А. Курбанлиев

Проектировщик: ООО «Эра проект»

Вместимость: 300 человек


№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,56 га
2	Площадь застройки храма	457,1 m ²
3	Общая площадь храма, в том числе	446,5 m ²
4	- подземная часть	215 m ²
5	- надземная часть	231,5 м ²
6	Строительный объем, в том числе	4567,3 м ³
7	- подземная часть	765 M^3
8	- надземная часть	$3802,3 \text{ M}^3$
9	Верхняя отметка	29,8 м
10	Этажность	1+подземный
11	Количество машиномест	15

Наименование храма	Храм святого мученика Андрея Стратилата в Люблине
Настоятель	протоиерей Сергий Белов
Дата назначения настоятеля:	09.12.2012, Указ У-01/613
Число священников в храме (кроме настоятеля)	нет
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма факт.	109559, г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, вл. 14
Округ	ЮВАО
Район	Люблино
Численность населения района (приблизительно)	150 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	5
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	2-3 км
- с востока	0 км (промзона)
- с юга	2 км (через автостоянку и ТЦ Москва)
- с запада	2 км (парк, аллея)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	30 чел.
Площадь участка	0.63 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	нет
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь иконы Божией Матери «Донская», вместимость: 70 чел.
Год начала строительства основного храма	-
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	-
Вместимость строящегося храма, всего:	300 чел.
- верхнего храма	300 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	К строительству не приступали
Выполненные работы	- Выполнена проектная документация стадии «П» (проект)
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата- цию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	-
Срок подготовки к Великому освящению	-
Примечания	-


Сведения о проекте и инженерных се	хях				
Архитектор (ФИО):	Курбанлиев К.А.	Курбанлиев К.А.			
Разработчик АГР:	ООО «Эра проект» (772	1571370)			
Год разработки АГР:	2020 г.				
Проектировщик:	ООО «Эра Проект» (772	21571370)			
Проектная документация:	Выполнена в полном об	ъеме			
Экспертная организация:	ООО «СК»РЕСУРС»				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-042652-2021	№ 77-2-1-3-042652-2021 от 2021 г.			
Рабочая документация:	-	-			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)	
	Электроснабжение:	Не получены			
	Теплоснабжение:	Не получены			
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Не получены			
M. C.	Канализация:	Не получены			
	Водосток:	Не получены			
	Газоснабжение:	Не получены			
	ГО ЧС и ПБ:	Не получены			


Храм Жен-Мироносиц


(спроектирован)

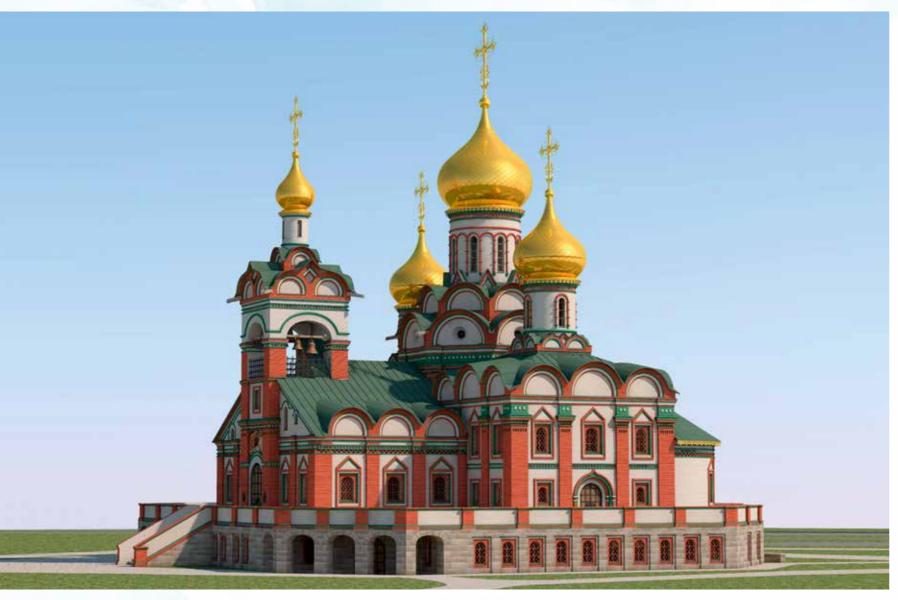




















Архитектор: И.П. Канаев

Проектировщик: ООО «Стил Про»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	4757 m ²
2	Площадь застройки	$1151,10 \text{ m}^2$
3	Общая площадь здания	2023,44 m ²
4	Высота храма (до барабана)	16,13 м ³
5	Этажность комплекса	1 + цокольный

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святых Жен-Мироносиц в Марьине
Настоятель	иерей Михаил Сергеев
Дата назначения настоятеля:	09.12.2012
Число священников в храме (кроме настоятеля)	1
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, ул. Белореченская, вл. 41
Округ	ЮВАО
Район	Марьино
Численность населения района (приблизительно)	272 тыс. чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	7
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	0,45 км
- с востока	1,3 км
- с юга	1,1 км
- с запада	0,9 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	80 чел.
Площадь участка:	0,46 ra
Собственник участка (ФХУ / Приход):	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	Отсутствие инвестора. Выполнен проект храма, проведена экспертиза проекта
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм святых Жен-Мироносиц, вместимость: 130 чел.
Год начала строительства основного храма	-
Цействующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	Не получено
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Гекущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Строительство не начато
Выполненные работы	- Оформлена проектная и рабочая документация, проект про шел экспертизу; - Подведено электричество; - Оплачен частично проект прокладки теплосети
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата- цию храмового комплекса	- Оплата (окончательная) проекта и работ по прокладке теплосети; - Оплата проектирования внутренних и внешних инженерны сетей; - Строительство храма
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	Дефицит финансирования
Срок ввода в эксплуатацию	-
Срок подготовки к Великому освящению	-
Примечания	С 2015 г. регулярные богослужения проходят во временном храме

Сведения о проекте и инженерных сет	ях				
Архитектор (ФИО):	Канаев И.П.	Канаев И.П.			
Разработчик АГР:	ООО «Стил Про» (ИНН	7719820911)			
Год разработки АГР:	2018 г.				
Проектировщик:	ООО «Стил Про» (ИНН	7719820911)			
Проектная документация:	Выполнена в полном обт	ьеме			
Экспертная организация	ООО «Мосэксперт»				
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения)	№ №77-2-1-3-038589-201	№ №77-2-1-3-038589-2019 от 27.12.2019 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью	Выполнена полностью			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)	
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Проведено	
Подключение к сетям:	Теплоснабжение:	Получены	Частично оплачены (669 287,37 руб.) Остаток 3 792 628, 42 руб.	Не подключено	
	Водоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено	
	Канализация:	Не получены	Не оплачены	Не подключено	
	Водосток:	Не получены	Не оплачены	Не подключено	
	Газоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено	
	ГО ЧС и ПБ:	Не получены	Не оплачены	Не подключено	


Пока строительство храма отложено, в связи с отсутствием финансирования


Храм Курской-Коренной иконы Божией Матери


(утвержден АГР)




















Архитектор: С.В. Борисов

Проектировщик: НП «Единая служба заказчика

Московской Патриархии»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	6400 м ²
2	Площадь застройки	949 м ²
3	Общая площадь комплекса, в том числе	1733,3 м ²
4	Общая площадь храма	$487,4 \text{ m}^2$
5	- надземная часть	$264,8 \text{ m}^2$
6	Общая площадь приходских помещений	1245,9 м ²
7	- наземная площадь	813,9
8	Строительный объем комплекса	12 265 м ³
9	- подземная часть	3715 m^3
10	- надземная часть	8550 m^3
11	Высота (верхняя отметка) храма	28,6 м
12	Высота приходской части	8 м
13	Этажность комплекса	2 + подземный
14	Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен	1536,4 м²
15	Количество парковочных мест на участке	5


Наименование храма	Храм Курской-Коренной иконы Божией Матери в Вязовке
Настоятель	иерей Сергий Тарасенко
Дата назначения настоятеля	28 мая 2013 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма	г. Москва, ул. Федора Полетаева, вл. 15
Округ	ЮВАО
Район	Рязанский
Численность населения района (приблизительно)	107 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1 км
- с востока	1 км (в другом районе)
- с юга	2 км (в другом районе через трассу)
- с запада	2 км (в другом районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	25-50 чел.
Площадь участка	0,656 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Отсутствие финансовых средств
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм Курской-Коренной иконы Божией Матери в Вязовке, вместимость: 100 чел.
Год начала строительства основного храма	-
Действующее разрешение на строительство (PC): Срок действия (спо) / или получение PC ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	Не получено
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	-
Выполненные работы	-
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	-
Срок подготовки к Великому освящению	-
Примечания	-


Сведения о проекте и инженерных сет	гях			
Архитектор (ФИО):	Борисов С.В.			
Разработчик АГР:	НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (ИНН 7726512555, ОГРН 1047796837384)			
Год разработки АГР:	2020 г.			
Проектировщик:	НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (ИНН 7726512555, ОГРН 1047796837384			
Проектная документация:	Пока работы отложены			
Экспертная организация:	-			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	-		- 81	
Рабочая документация:				
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполно но (да/нет)
	Электроснабжение:	Не получены		
	Теплоснабжение:	Не получены		


	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)
	Электроснабжение:	Не получены		
	Теплоснабжение:	Не получены		
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Не получены		
	Канализация:	Не получены		
	Водосток:	Не получены		
	Газоснабжение:	Не получены		
	ГО ЧС и ПБ:	Не получены		


Храм преподобного Александра Свирского


(проектируется)

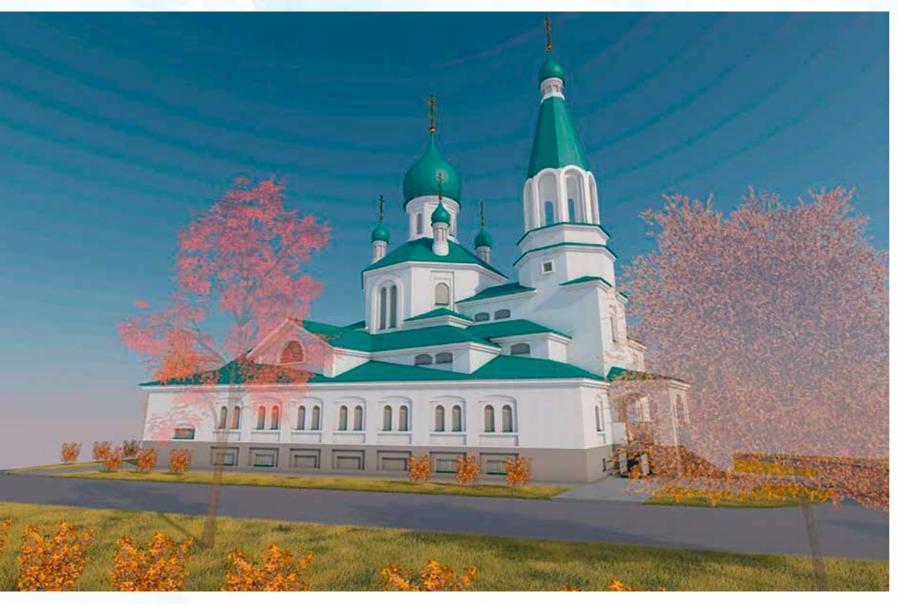


















Архитекторы: С.В. Кишиневский, А.А. Суханова Проектировщик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

Вместимость: 500 человек

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	0,205 га
2	Площадь застройки храма	474 m ²
3	Общая площадь храма, в том числе	$826,4 \text{ m}^2$
4	- подземная часть	$334,1 \text{ m}^2$
5	- надземная часть	$492,3 \text{ m}^2$
6	Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен	$690,1 \text{ m}^2$
7	Строительный объем	5884 m^3
8	- подземная часть	1692,6 м ³
9	- надземная часть	4191,4 м3
10	Этажность	1+2(хоры)+
	JIAMIOCID	тех.подполье
11	Отметка до низа яблока	25,4 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200		
Наименование храма	Храм преподобного Александра Свирского в Грайворонове	
Настоятель	протоиерей Леонид Наземнов	
Дата назначения настоятеля	25.12.2017	
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-	
Викарий	архиепископ Егорьевский Матфей	
Адрес храма	г. Москва, ул. Грайвороновская, вл. 10	
Округ	Юго-Восточный	
Район	Текстильщики	
Численность населения района (приблизительно)	100 000 чел.	
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	2	
Удаленность от ближайших храмов, км:		
- с севера	2 км (в другом районе через Рязанский проспект)	
- с востока	2 KM	
- с юга	10 км (в другом районе через трассу)	
- с запада	10 км (в другом районе через шоссе)	
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	около 30 чел. в воскресные дни, около 50 – на праздники	
Площадь участка	0.22 ra	
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ	
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Наличие коммуникаций, транспортные развязки, малая площадь участка, из-за этого дом причта проектируется под храмом.	
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм преподобного Александра Свирского, вмест мость: 50 чел.	
Год начала строительства основного храма	-	
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (спо) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС не получено	
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.	
- верхнего храма	500 чел.	
- нижнего храма	-	
Выполненные работы	- Оформлена проектная документация, приступили к разрабо ке рабочей документации	
Примечания	С 2017 г. начаты регулярные богослужения во временном хра Подрядчик не выбран. ТУ частично получены	

Сведения о проекте и инженерных сет	ях			
Архитектор (ФИО):	Кишиневский С.В., Суханова А.А.			
Разработчик АГР:	НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (ИНН 7726512555, ОГРН 1047796837384)			
Год разработки АГР:	2022 г.			
Проектировщик:	НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (ИНН 7726512555, ОГРН 1047796837384)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	ООО Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-021016-2023 от 21.04.2023 г.			
Рабочая документация:	Пока не выполнена			
	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполне- но (да/нет)
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены 884 000 руб.	Не подключено
	Теплоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
Подключение к сетям:	Водоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	Канализация:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	Водосток:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	Газоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
